

建设项目竣工环境保护验收调查报告表

项目名称：新建码头项目

委托单位：常熟市巨达新型建材有限公司

编制单位：常熟市巨达新型建材有限公司

2021 年 4 月

目录

第一部分：前言

第二部分：竣工环境保护验收调查表

第三部分：竣工环境保护验收意见

第四部分：其他需要说明事项

第一部分 前言

本项目码头位于常熟市尚湖镇翁家庄村。300 吨泊位位于望虞河西岸，根据现场踏勘，本项目东侧为望虞河，北侧、南侧均为农田，西侧为一些工业企业。

常熟市巨达新型建材有限公司投资 500 万元于 2008 年租赁下尚湖镇翁家庄村土地 5500m²，建设了一座砂石堆场，目前码头进行黄砂、散装水泥的转运，并占用望虞河岸线 20 米。码头设有 1 个 300 吨的泊位，码头前沿设有 3 吨吊机 1 台，年经营黄砂、散装水泥共 20 万吨。由于历史原因，该项目并未办理环境影响评价手续，根据业主提供资料，目前码头已运营 13 年，在运营期间未曾发生污染纠纷问题。

根据市政府办公室印发《常熟市内河港口码头环保问题整改方案》的通知（常政办发[2020]150 号）的相关精神和要求，常熟市巨达新型建材有限公司申请补办码头堆场项目环境影响评价手续，通过整改做到依法纳规。

根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的有关要求，该项目于 2021 年 3 月完成环境影响评价工作，并在 2021 年 3 月取得苏州市行政审批局审批意见(苏行审环评【2021】20185 号)。2021 年 3 月，常熟市巨达新型建材有限公司委托江苏中之盛环境科技有限公司对本项目进行验收监测指导。

一、环保执行情况：

该项目执行了环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度。

（一）废水

本项目冲洗废水和雨水径流经沉淀池收集处理后回用于喷淋抑尘，设备、运输车辆和码头面及道路冲洗。路面喷洒水基本通过挥发损耗，装卸、堆场抑尘用水主要被黄砂吸收，无生产废水排放。舱底含油废水接收后定期委托常熟中法工业污水预处理有限公司处理。船舶生活污水接收后与陆域生活污水经过分散式污水处理装置处理后委托常熟市中创污水处理有限公司清运处置。

（二）噪声

本项目营运期通过选用低噪声设备、禁鸣、合理控制落料高度、距离衰减等措施来降低噪声量。

（三）废气

本项目砂石装卸、堆场风扬尘、运输起尘通过封闭料棚、喷淋抑尘、保持道路清洁来降低起尘量。

（四）固废

本项目运行期间生活垃圾由环卫所清运处置，沉淀池污泥混入砂石中外售。固废零排放。

（五）生态

本项目码头泊位沿望虞河顺岸式布置，不占用望虞河的水域通道，对鱼类生存及洄游产生的影响较小。船舶航行会对周围水体产生扰动，这些会对水生生物的生物量、种类及栖息环境产生一定影响。由于船舶是在水体上层航行，主要影响也集中在上层水域，水生生物除富有生物在水体表层活动强度较大外，其他生物多在中层及底层活动，且

水生生物除浮游生物在水体表层活动强度较大外，其他生物多在中层及底层活动，且水生生物的浮动性较强，会自动规避船舶带来的扰动。因此，船舶航行不会改变水生生物的栖息环境，也不会使生物种类、数量明显减少。

二、验收监测结果：

江苏中之盛环境科技有限公司于 2021 年 3 月 24-25 日对该项目废气、废水、噪声污染防治设施运行进行了验收监测，具体结果如下：

1、验收监测期间，颗粒物排放符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表 3 规定的大气污染物排放限值。

2、验收监测期间，厂界的昼间噪声均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 2 类标准（其中东南侧执行 4 类）。

3、验收监测期间，沉淀池沉淀处理后可满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1限值。

4、验收监测期间，望虞河水环境质量：望虞河（码头下游）水质（pH、COD、NH₃-N、TP、高锰酸钾指数、石油类）能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准（SS满足《地表水资源质量标准》（SL63-94）三级标准）。

5、生活垃圾由环卫所清运处置，沉淀池污泥混入砂石外售，不会对外环境产生二次污染。

第二部分

建设项目竣工环境保护验收调查报告表

项目名称：新建码头项目

委托单位：常熟市巨达新型建材有限公司

编制单位：常熟市巨达新型建材有限公司

2021 年 4 月

编制单位：常熟市巨达新型建材有限公司

法人：沈耀耀

技术负责人：刘子峰

项目负责人：刘子峰

编制人员：刘子峰

监测单位：江苏中之盛环境科技有限公司

参加人员：/

编制单位联系方式

电话：13776222806

传真：/

地址：江苏省常熟市尚湖镇翁家庄村

邮编：215500

表 1 项目总体情况

建设项目名称	新建码头项目				
建设单位	常熟市巨达新型建材有限公司				
法人代表	沈耀耀	联系人		刘子峰	
通信地址	江苏省常熟市尚湖镇翁家庄村				
联系电话	13776222806	传真	/	邮编	215500
建设地点	江苏省常熟市尚湖镇翁家庄村				
项目性质	新建（补办环评手续）		行业类别	G5532 货运港口	
环境影响报告表名称	常熟市巨达新型建材有限公司新建码头项目				
环境影响评价单位	江苏中之盛环境科技有限公司				
初步设计单位	/				
环境影响评价审批部门	苏州市行政审批局	文号	苏行审环评【2021】20185号	审批时间	2021.3.11
初步设计审批部门	/	文号	/	审批时间	/
环境保护设施设计单位	/				
环境保护设施施工单位	常熟市巨达新型建材有限公司				
环境保护设施监测单位	江苏中之盛环境科技有限公司				
投资总概算（万元）	500	其中：环境保护投资（万元）	15	实际环境保护投资	3%
实际总投资（万元）	500	其中：环境保护投资（万元）	15	占总投资比例	3%
设计建设规模	利用占地面积 5500 平方米，购置相关设备，建设一个 300 吨级的货运码头泊位，年运输黄砂、袋装水泥 20 万吨。		建设项目开工日期	已建项目，补办环评手续	
实际建设规模	利用占地面积 5500 平方米，购置相关设备，建设一个 300 吨级的货运码头泊位，年运输黄		投入试运行日期	已建项目，补办环评手续	

	砂、袋装水泥 20 万吨。		
调查经费	/		
项目建设过程简述 (项目立项~试运行)	根据市政府办公室印发《常熟市内河港口码头环保问题整改方案》的通知（常政办发[2020]150 号）的相关精神和要求，常熟市路桥工程有限公司申请补办码头堆场项目环境影响评价手续，通过整改做到依法纳规。 本项目于 2021 年 1 月 11 日取得常熟市行政审批局备案（常行审投备[2021]61 号）。于 2021 年 3 月 11 日取得环评批复苏行审环评【2021】20185 号。之后委托江苏中之盛环境科技有限公司进行环保竣工验收调查指导。江苏中之盛环境科技有限公司于 2021 年 3 月 24 日、3 月 25 日进行实地监测以及收集周边群众意见，指导企业编制了本报告。 3 月 18 日常熟市巨达新型建材有限公司新建码头项目进行竣工环保验收前公示，即征求公众意见。网址： https://www.jszszs.com.cn/cate/ela.html?filter=&id=16&diyname=ela&page=2		

表 2 调查范围、因子、目标、重点

调查范围	空气环境：厂界上下风向 声环境：码头四周 水：沉淀池进出水																																															
调查因子	空气环境：颗粒物 声环境：码头四周噪声 水：SS																																															
环境敏感目标	<table><tr><td>环境要素</td><td>环境保护对象名称</td><td>方位</td><td>距项目厂界距离（m）</td><td>备注</td><td>规模</td><td>环境功能</td></tr><tr><td>大气环境</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr><tr><td rowspan="2">水环境</td><td>望虞河</td><td>东南</td><td>12</td><td>/</td><td>中等河道</td><td>（GB3838-2002）Ⅲ类水质</td></tr><tr><td>锡北运河</td><td>东北</td><td>300</td><td>/</td><td>中等河道</td><td>（GB3838-2002）Ⅳ类水质</td></tr><tr><td>声环境</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr><tr><td>生态环境</td><td>望虞河（常熟市）清水通道维护区</td><td>东南</td><td>范围内</td><td>/</td><td>11.82km²</td><td>水源水质保护</td></tr></table>							环境要素	环境保护对象名称	方位	距项目厂界距离（m）	备注	规模	环境功能	大气环境	/	/	/	/	/	/	水环境	望虞河	东南	12	/	中等河道	（GB3838-2002）Ⅲ类水质	锡北运河	东北	300	/	中等河道	（GB3838-2002）Ⅳ类水质	声环境	/	/	/	/	/	/	生态环境	望虞河（常熟市）清水通道维护区	东南	范围内	/	11.82km ²	水源水质保护
	环境要素	环境保护对象名称	方位	距项目厂界距离（m）	备注	规模	环境功能																																									
	大气环境	/	/	/	/	/	/																																									
	水环境	望虞河	东南	12	/	中等河道	（GB3838-2002）Ⅲ类水质																																									
		锡北运河	东北	300	/	中等河道	（GB3838-2002）Ⅳ类水质																																									
	声环境	/	/	/	/	/	/																																									
	生态环境	望虞河（常熟市）清水通道维护区	东南	范围内	/	11.82km ²	水源水质保护																																									
调查重点	（1）核查实际工程内容及方案设计变更情况； （2）环境敏感保护目标基本情况及变更情况； （3）实际工程内容及方案设计变更造成的环境影响变化情况； （4）环境影响评价制度执行情况； （5）环境影响评价文件及环境影响审批文件中提出的主要环境影响； （6）环境保护设计文件、环境影响评价文件及环境影响审批文件中提出的环境保护措施落实情况及其效果； （7）验收环境影响评价文件对污染因子达标情况的预测结果； （8）工程环保投资情况。																																															


表 3 验收执行标准

环境质量标准	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）：东南侧厂界执行 4a 类标准（昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)），东北、西南、西北侧厂界执行 2 类标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)） 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表 1 限值																
污染物排放标准	1、大气污染物排放标准																
	项目产生的颗粒物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表 3 无组织排放限值，见表 3-1。																
	表3-1 大气污染物综合排放标准																
	<table><tr><th rowspan="2">污染物名称</th><th colspan="2">无组织排放监控浓度限值</th><th rowspan="2">标准来源</th></tr><tr><th>监控点</th><th>浓度 mg/m³</th></tr><tr><td>颗粒物</td><td>厂界外 20 米处上风向设参照点，下风向设监控点</td><td>0.5（监控点与参照点总悬浮颗粒物 TSP1 小时浓度值的差值）</td><td>《水泥工业大气污染物排放标准》 (GB4915-2013)</td></tr></table>					污染物名称	无组织排放监控浓度限值		标准来源	监控点	浓度 mg/m ³	颗粒物	厂界外 20 米处上风向设参照点，下风向设监控点	0.5（监控点与参照点总悬浮颗粒物 TSP1 小时浓度值的差值）	《水泥工业大气污染物排放标准》 (GB4915-2013)		
	污染物名称	无组织排放监控浓度限值		标准来源													
监控点		浓度 mg/m ³															
颗粒物	厂界外 20 米处上风向设参照点，下风向设监控点	0.5（监控点与参照点总悬浮颗粒物 TSP1 小时浓度值的差值）	《水泥工业大气污染物排放标准》 (GB4915-2013)														
2、水污染物排放标准																	
本项目陆域废水主要包括生活污水、冲洗废水和雨水径流。冲洗用水和雨水径流收集于沉淀池，充分沉淀后回用。故陆域废水仅排放陆域生活污水，项目陆域生活污水经过分散式污水处理装置处理后清运处理。尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的表 1 中一级（A）标准和苏州特别排放限值。																	
本项目船舶废水主要包括到港船舱底层含油废水和船舶生活污水。到港船舶舱底含油污水委托常熟中法工业污水预处理有限公司处理。船舶生活污水接收后与陆域生活污水经过分散污水处理装置处理后清运处理。																	
表3-2 废水污染物排放标准																	
<table><tr><th>排放口名称</th><th>执行标准</th><th>取值表号 标准级别</th><th>指标</th><th>标准限值</th><th>单位</th></tr><tr><td>项目生活污水</td><td>污水处理厂接管</td><td>—</td><td>pH</td><td>6~9</td><td>无量纲</td></tr></table>						排放口名称	执行标准	取值表号 标准级别	指标	标准限值	单位	项目生活污水	污水处理厂接管	—	pH	6~9	无量纲
排放口名称	执行标准	取值表号 标准级别	指标	标准限值	单位												
项目生活污水	污水处理厂接管	—	pH	6~9	无量纲												

	水总排口	标准		COD	500	mg/L	
				SS	250	mg/L	
				氨氮	35	mg/L	
				TP	3	mg/L	
	项目舱底含油废水排口	接收污水厂接管标准	—	石油类	按约定标准（见委托合同）		
	污水厂排放口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）	表 1 一级 A	pH	6~9	无量纲	
				SS	10	mg/L	
		《市委办公室 市政府办公室印发<关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见>的通知》（苏委办发[2018]77号）	附件 1 苏州特别排放限值标准	COD	30	mg/L	
				氨氮	1.5（3）*	mg/L	
				TN	10	mg/L	
				TP	0.3	mg/L	
		接收污水厂排放标准	—	石油类	根据接收污水厂排放标准确定		
	3、噪声排放标准						
	本项目东南侧厂界位于望虞河航道两侧内，噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，其余三侧厂界执行2类标准，具体标准值见表3-3。						
	表3-3 工业企业厂界环境噪声排放标准						
标准级别		昼间		夜间			
4 类		≤70dB(A)		≤55dB(A)			
2 类		≤60dB(A)		≤50dB(A)			
4、固废贮存标准							
固体废物严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《江苏省固体废物污染环境防治条例》，一般固废贮存及处置执行《一般工业废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求。							
总量控制指标	表3-4 项目污染物排放总量指标（单位：t/a）						
	类别	污染物名称	产生量（t/a）	削减量（t/a）	接管量/排放量（t/a）		建议申请总量（t/a）
					接管量	排入外环境量	

	废气 （无组织）	颗粒物	3.498	3.3581	0.1399		0.1399
	陆域及船舶 生活污水	水量	280	0	280	280	280
		COD	0.14	0	0.14	0.0084	0.14
		SS	0.07	0	0.07	0.0028	0.07
		NH ₃ -N	0.0098	0	0.0098	0.00084	0.0098
		TP	0.00084	0	0.00084	0.000084	0.00084
	舱底含油 废水	水量	8.1	0	8.1	根据接收污水处理厂排放标准确定	/
		石油类	0.04	0	0.04		
	雨水径流	水量	1911.6	1911.6	0		0
		SS	0.956	0.956	0		0
	冲洗废水	水量	2401.9	2401.9	0		0
		SS	12	12	0		0
	固废	陆域生活垃圾	3	3			0
		船舶生活垃圾	0.75	0.75	0		0
		沉淀池污泥	10.36	10.36	0		0
	废水：生活污水排放总量纳入常熟市中创污水处理有限公司总量范围内。船舶含油废水纳入接收污水处理厂总量范围内。						
废气：本项目排放的少量废气在区域内平衡。							
固废：本项目实施后固体废物全部得以处置，固废外排量为零。因此，本项目不需要申请固体废物排放总量指标。							

表 4 工程概况

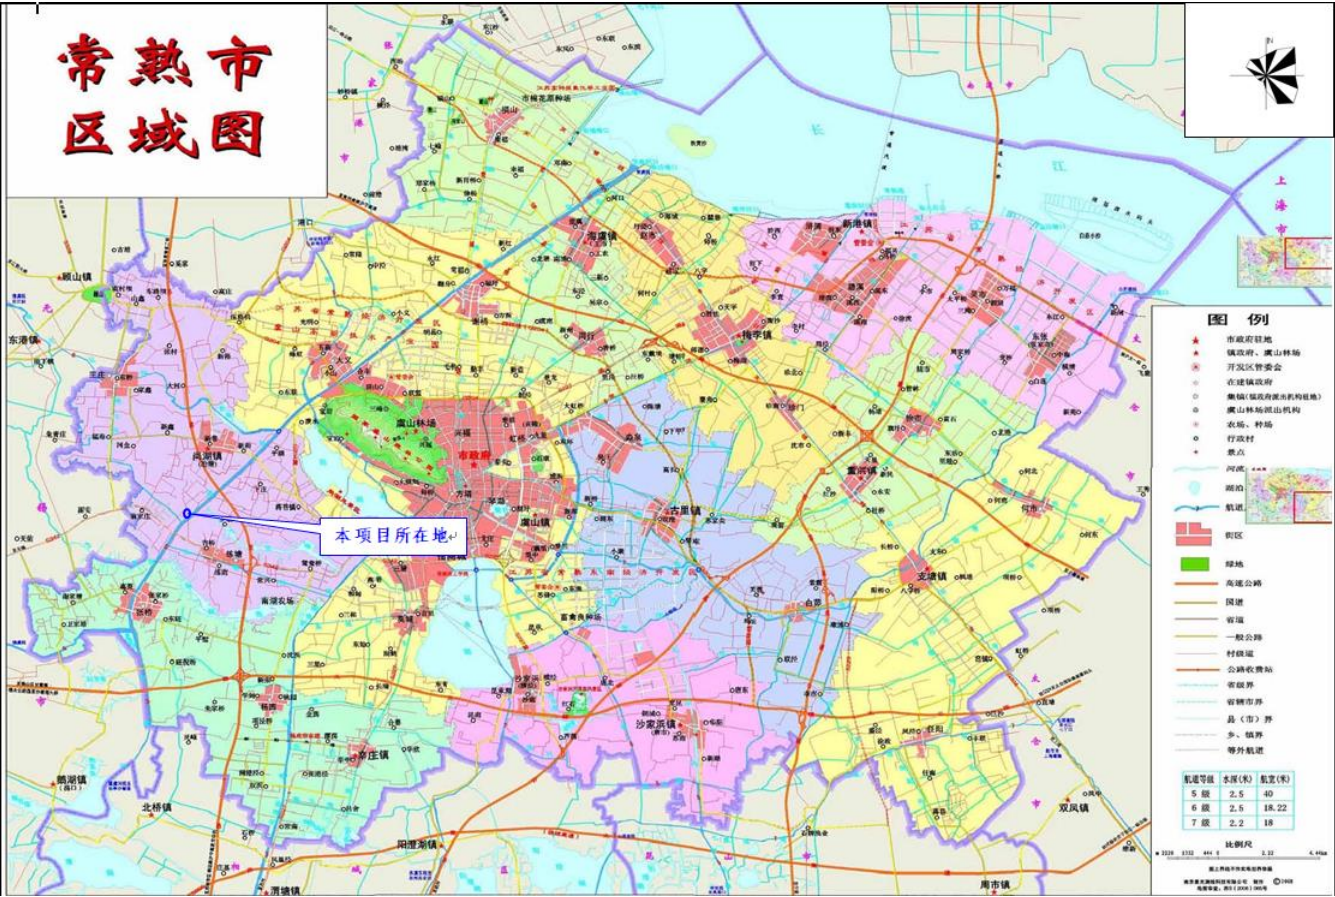项目名称	新建码头项目
项目地理位置 (附地理位置图)	项目位于常熟市尚湖镇翁家庄村，如图所示： 

主要工程内容及规模:

利用占地面积 5500 平方米,购置相关设备,建设一个 300 吨级的货运码头泊位,年吞吐黄砂、散装水泥 20 万吨。

职工人数、工作制度:项目定员 10 人,白班工作 8 小时,根据运输船舶靠泊日和运转情况,年作业日约 300 天。

实际工程量及工程建设情况,说明工程变化原因

依据环办[2015]52 号文《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》,根据其中《港口建设项目重大变动清单(试行)》判断此变动是否属于重大变动,具体见表 4-1。


表 4-1 项目变动情况一览表

序号	类别	《港口建设项目重大变动清单(试行)》内容	项目对照情况
1	性质	码头性质发生变动,如干散货、液体散货、集装箱、多用途、件杂货、通用码头等各类码头之间的转化。	不涉及
2	规模	码头工程泊位数量增加、等级提高、新增罐区(堆场)等工程内容。	不涉及
3		码头设计通过能力增加 30%及以上。	不涉及
4		工程占地和用海总面积(含陆域面积、水域面积、疏浚面积)增加 30%及以上。	不涉及
5		危险品储罐数量增加 30%及以上。	不涉及
6	地点	工程组成中码头岸线、航道、防波堤位置调整使得评价范围内出现新的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区和要求更高的环境功能区。	不涉及
7		集装箱危险品堆场位置发生变化导致环境风险增加。	不涉及
8	生产工艺	干散货码头装卸方式、堆场堆存方式发生变化,导致大气污染源强增大。	不涉及

9		集装箱码头增加危险品箱装卸作业、洗箱作业或堆场。	不涉及
10		集装箱危险品装卸、堆场、液化码头新增危险品货类（国际危险品分类：9 类），或新增同一货类中毒性、腐蚀性、爆炸性更大的货种。	不涉及
11	环境保护措施	矿石码头堆场防尘、液化码头油气回收、集装箱码头压载水灭活等主要环境保护措施或环境风险防范措施弱化或降低。	不涉及

结合环办[2015]52 号文《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》中《港口建设项目重大变动清单（试行）》，进行综合分析，本公司的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施均未发生重大变动，未构成重大变动。

生产工艺流程（附流程图）

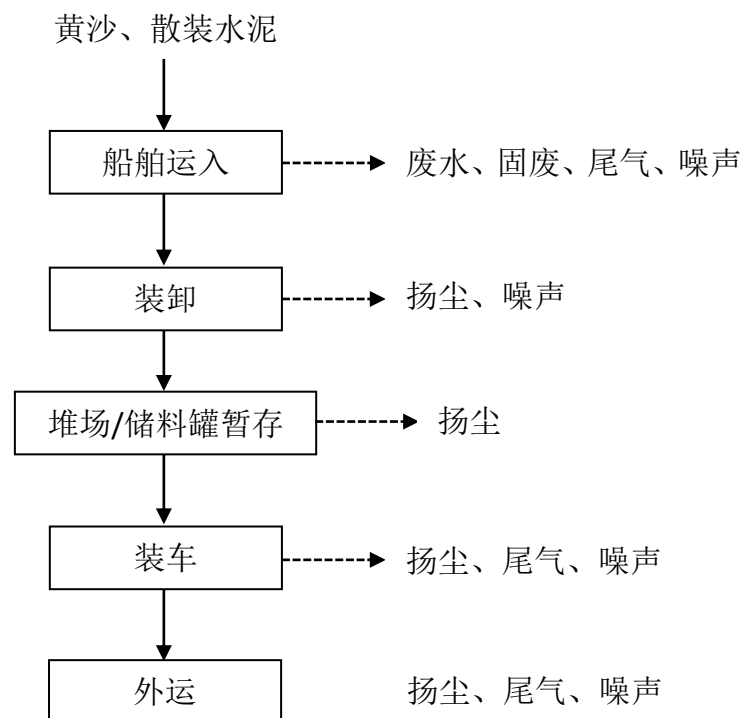

工艺流程说明:

①散货船进港停靠在泊位上,会产生船舶生活污水、船舶舱底含油废水、船舶生活垃圾、船舶尾气、噪声。


②通过吊机、料斗、输送带将黄沙从散货船上装卸到堆场暂存,通过管道将散装水泥输送至储料站暂存,此过程会产生装卸扬尘、噪声、堆场风扬尘。

③装车外运,黄沙采用铲车装车后外运,散装水泥利用管道输送到汽车上外运,此过程会产生铲车尾气、装卸扬尘、汽车尾气、道路扬尘、噪声。

注：本项目散装水泥由密闭管道输入至储料站，再使用管道输送至汽车，储料站和管道均为封闭空间，因此本项目不考虑散装水泥的装卸起尘。同时根据《逸散性工业粉尘控制技术》第十三章水泥厂表13-2 水泥生产的逸散性排放因子中水泥贮仓排气可以忽略不计，本项目水泥仓储过程的排放也忽略不计。

工程占地及平面布置（附图）

本项目不占用水域面积，无新增岸线，利用陆域约 5500m²。

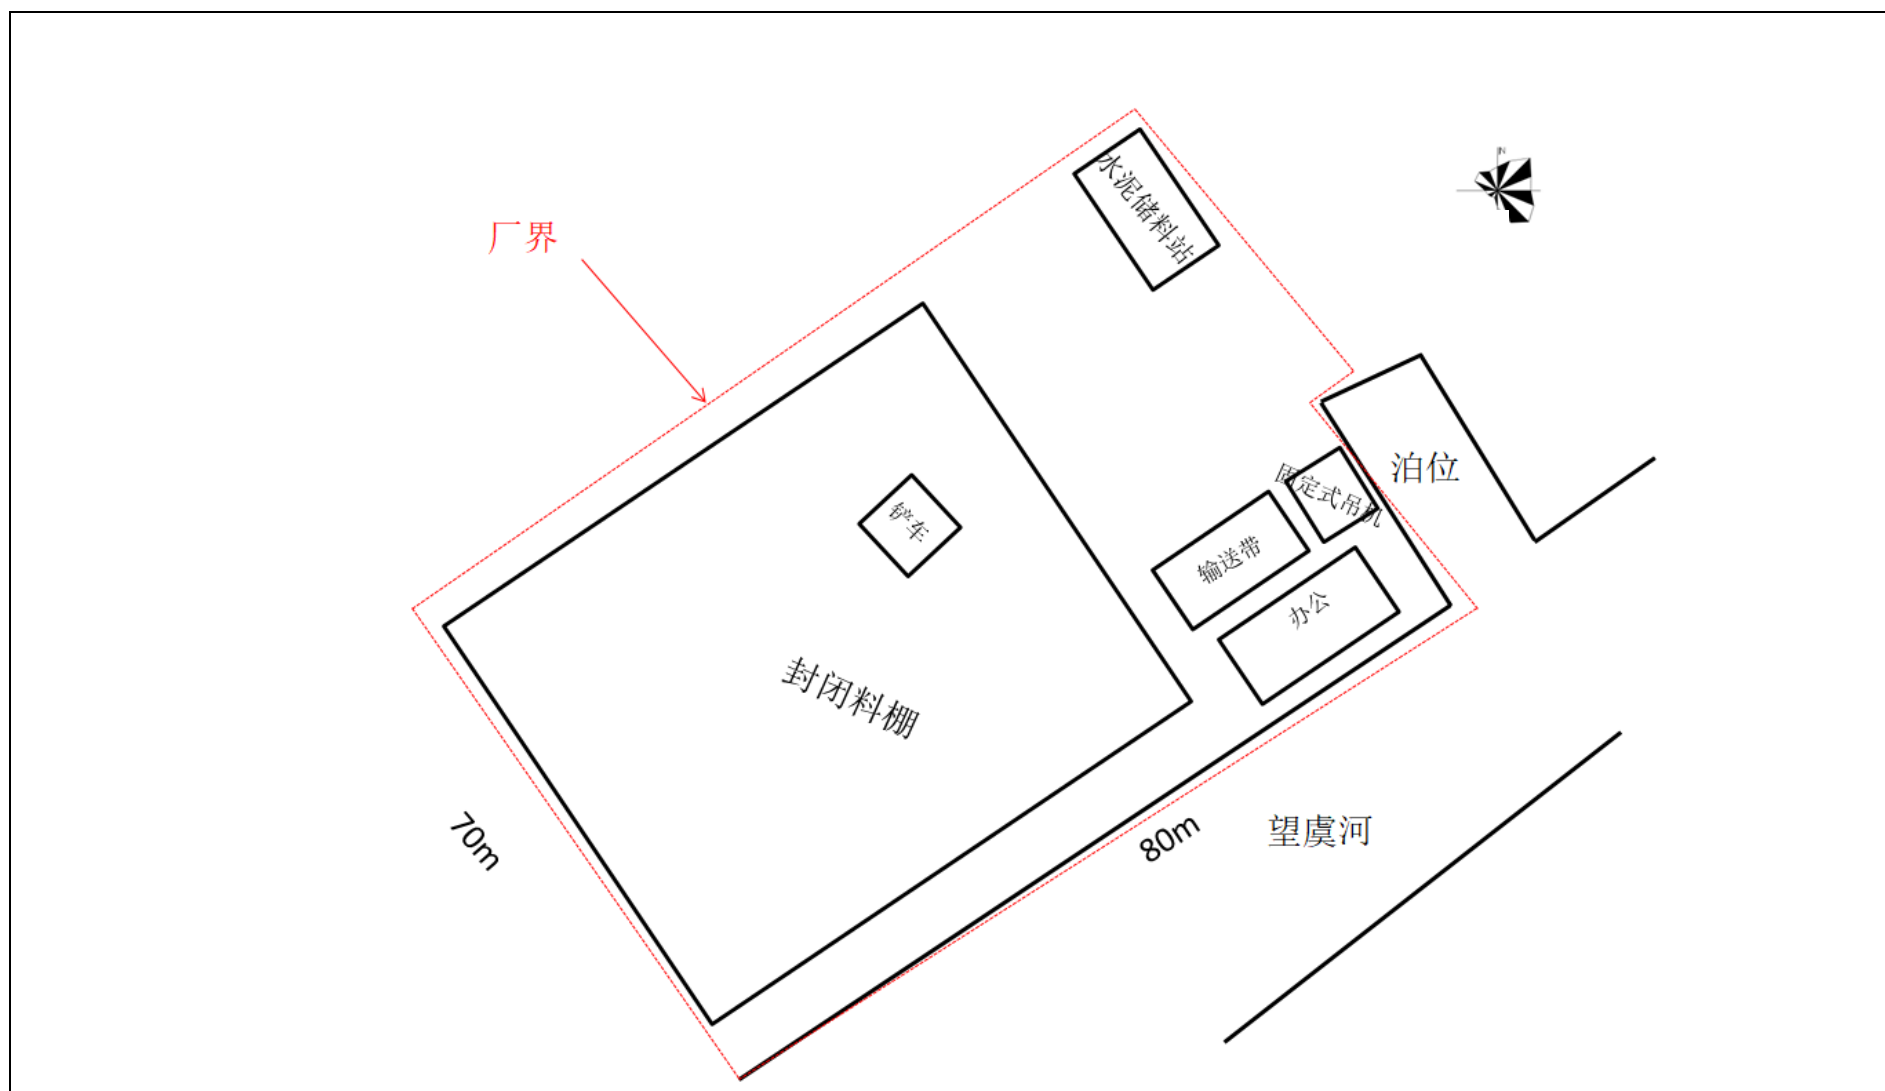

工程环境保护投资明细

本项目为已建项目，补办环评手续，因此环境工程保护投资中不涉及生态保护投资。详见下表。

表4-2 工程环保投资一览表

序号	环保措施概要	投资额（万元）
1	水喷淋、封闭料棚堆场	5
2	船舶含油污水处理、生活污水接管	3
3	沉淀池	5
4	固废处置	1
5	跟踪监测	1
合计		15

与项目有关的生态破坏和污染物排放、主要环境问题及环境保护措施

1、废气

本项目大气污染物主要有装卸粉尘、堆场风扬尘、道路扬尘及交通尾气。砂石装卸粉尘通过水喷淋降尘；堆场风扬尘通过封闭料棚式堆场降低起尘量。船舶、车辆废气忽略不计。最终厂界颗粒物能够达标排放，对区域大气环境影响较小。

2、废水

本项目冲洗废水和雨水径流经沉淀池收集处理后回用于喷淋抑尘，设备、运输车辆和码头面及道路冲洗。路面喷洒水基本通过挥发损耗，装卸、堆场抑尘用水主要被黄砂吸收，无生产废水排放。舱底含油废水接收后定期委托常熟中法工业污水预处理有限公司处理。船舶生活污水接收后与陆域生活污水经过分散式污水处理装置处理后清运至常熟市中创污水处理有限公司处理，尾水排入锡北运河。

3、噪声

本项目噪声主要来源于靠泊船舶、铲车、运输汽车交通噪声、砂石装卸的落料噪声以及装卸设备的运行噪声，其源强为 70-80dB（A）。通过加强船岸协调，尽量减少靠泊船舶鸣笛次数，并且要求靠泊船舶装卸过程中停用辅机，所以船舶噪声的影响较小。尽可能选用低噪声的设备以及加强物料装卸的合理性来最大限度减少机械噪声源的影响。最终厂界噪声可以达标排放。

4、固废

本项目运营期固体废物主要为生活垃圾（船舶和陆域）和沉淀池污泥。沉淀池污泥混入砂石中一同出售，生活垃圾由环卫所清运处置。各类固废都得到妥善处理，不会产生二次污染，对项目周围环境影响较小。

表 5 环境影响评价回顾

环境影响评价的主要环境影响预测及结论（生态、声、大气、水、振动、电磁、固体废物等）

1、废气

本项目在砂石装卸、堆场风扬尘、运输起尘过程中会产生颗粒物废气，无组织排放，通过水喷淋和封闭料棚式抑尘后，对大气环境影响可以接受。

本项目以厂界边界 50 米外形成的包络线为卫生防护距离。

在本项目的卫生防护距离内没有民宅等环境保护敏感目标，在后期建设过程中，严禁在项目卫生防护距离范围内新建住宅区、学校、医院等环境保护敏感点。

2、废水

本项目冲洗废水和雨水径流经沉淀池收集处理后回用于喷淋抑尘，设备、运输车辆和码头面及道路冲洗。路面喷洒水基本通过挥发损耗，装卸、堆场抑尘用水主要被黄砂吸收，无生产废水排放。舱底含油废水接收后定期委托常熟中法工业污水预处理有限公司处理。船舶生活污水接收后与陆域生活污水经过分散式污水处理装置处理后清运至常熟市中创污水处理有限公司处理，尾水排入锡北运河。

3、噪声

厂区内采取禁鸣、合理布局、控制落料高度等措施，项目正常营运期间，东北、西南、西北厂界噪声可达到国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准，东南侧厂界噪声可达 4 类标准。

4、固废

本项目产生的沉淀砂石企业收集后混入砂石中共同外售；生活垃圾（船舶和陆域）镇环卫清运处理，各类固废都得到妥善处理，不会产生二次污染，对项目周围环境影响较小。

5、生态环境

本项目码头泊位沿望虞河顺岸式布置，不占用望虞河的水域通道，对鱼类生存及洄游产生的影响较小。船舶航行会对周围水体产生扰动，这些会对水生生物的生物量、种类及栖息环境产生一定影响。由于船舶是在水体上层航行，主要影响也集中在上层水域，水生生物除富有生物在水体表层活动强度较大外，其他生物多在中层及底层活动，且水生生物除浮游生物在水体表层活动强度较大外，其他生物多在中层及底层活动，且水生

生物的浮动性较强，会自动规避船舶带来的扰动。因此，船舶航行不会改变水生生物的栖息环境，也不会使生物种类、数量明显减少。

环评审批意见

根据建设单位委托江苏中之盛环境科技有限公司编制的《常熟市巨达新型建材有限公司新建码头项目环境影响报告表》的评价结论，你公司在常熟市尚湖镇翁家庄村，新建码头（设置 1 个 300 吨级的泊位，主要从事黄砂、水泥装卸，年吞吐量为 20 万吨）项目（项目代码：2101-320581-89-01-786798）是可行的。要求严格按环境影响报告表所述认真落实各项污染防治措施和事故风险防范措施，并着重注意以下几个方面：

一、按“雨污分流、清污分流”的原则建设厂区排水管网，本项目不得有生产工艺废水排放。本项目码头生活污水及船舶生活污水接管至常熟市中创污水处理有限公司集中处理；船舶含油废水经专用收集器收集后委托常熟市中法工业污水预处理有限公司进行处理。

二、本项目能源用电，不得设置燃煤炉（窑）；本项目采用封闭料棚式堆场，输送带设置密封罩，装卸扬尘采取水喷淋抑尘措施，本项目颗粒物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表 3 标准。加强生产管理，减少大气污染物无组织排放。

三、合理布局，选用低噪声设备，采取有效消声、隔声、防振措施，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类（东南侧执行 4 类标准）标准。

四、妥善处置或综合利用其他各类一般工业固体废弃物，生活垃圾（船舶+陆域）委托当地环卫部门处置，固体废弃物零排放。

五、同意报告表所述以厂界边界为起点设置 50 米卫生防护距离的要求，在此范围内不得设置居民住宅等环境敏感目标。

六、该项目在设计、施工建设和生产中总平面布局以及主要工艺设备、储运措施、公辅工程、污染防治设施安装、使用中设计安全生产的应遵循设计使用规范和相关主管部门要求。

七、建设单位应对环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

八、按苏环控[97]122 号文要求，规范设置各类排污口和标识。建设单位应按环评报告所述的企业自行监测要求规范开展自行监测。

九、该项目实施后，建设单位应在排放污染物之前按照国家规定的程序和要求向环保部门办理排污许可相关手续，做到持证排污、按证排污。按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》办理环保设施竣工验收手续、需要配套建设的环境保护设施未建成，未经验收或经验收不合格，建设项目已投入生产或者使用的，生态环境部门将依法进行查处。

十、苏州市常熟生态环境局组织开展该工程的“三同时”监督检查和日常监督管理工作，苏州市环境监察支队负责不定期抽查。

十一、建设单位是该建设项目环境信息公开的主体，须自收到我局批复后及时将该项目报告表的最终版本予以公开。同时应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发[2015]162 号）做好建设项目开工前、施工期和加成后的信息公开工作。

十二、如该项目所涉及污染物排放标准发生变化，应执行最新的排放标准。

十三、该项目在建设过程中若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施、设施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自批准之日起，如超过 5 年方决定工程开工建设的，环境影响评价文件须重新审核。

表 6 环境保护措施执行情况

项目 阶段		环境影响报告表及审批文件中要求的环境保护措施	环境保护措施落实情况	措施执行效果及未采取措施的原因
施工期	生态影响	/	/	/
	污染影响	/	/	/
	社会影响	/	/	/
运行期	生态影响	/	/	/
	污染影响	①本项目产生的颗粒物废气通过水喷淋、封闭料棚式堆场等措施降尘。 ②：本项目冲洗废水和雨水径流经沉淀池收集处理后回用于喷淋抑尘，设备、运输车辆和码头面及道路冲洗。路面喷洒水基本通过挥发损耗，装卸、堆场抑尘用水主要被黄砂吸收，无生产废水排放。舱底含油废水接收后定期委托常熟中法工业污水预处理有限公司处理。船舶生活污水接收后与陆域生活污水一并接管至常熟市中创污水处理有限公司处理，尾水排入锡北运河。 ③本项目生活垃圾委托镇环卫所清运处置。沉淀池污泥收集后与砂石料共同外售。 ④对于靠泊船舶，加强船岸协调，禁止使用高音喇叭，尽量减少鸣笛次数，停泊后停辅机并使用岸电。砂石卸船、堆高作业时，合理控制落料高度，降低砂石落地产生的噪声，吊机选用低噪声设备，夜间禁止船舶停靠，	①本项目采用封闭料棚式堆场，装卸配备水喷淋，输送带密封罩，能够落实环评和批复中所提的环保措施要求。 ②：本项目冲洗废水和雨水径流经沉淀池收集处理后回用于喷淋抑尘，设备、运输车辆和码头面及道路冲洗。路面喷洒水基本通过挥发损耗，装卸、堆场抑尘用水主要被黄砂吸收，无生产废水排放。舱底含油废水接收后定期委托常熟中法工业污水预处理有限公司处理。船舶生活污水接收后与陆域生活污水经过分散式污水处理装置处理后清运至常熟市中创污水处理有限公司处理，尾水排入锡北运河。属于一般变动。 ③本项目生活垃圾委托镇环卫所清运处置。沉淀池污泥收集后与砂石料共同外售。能够落实环评和批复中固废处理要求。 ④本项目运营过程中设置禁鸣标志，砂石装卸合	无组织颗粒物达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3标准；码头四周噪声排放标准达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类(东南侧4类)标准；冲洗废水和雨水径流经沉淀池处理后达《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1限值。

		且不得进行砂石装卸作业。	理控制落料高度，选用低噪声设备，能够落实环评和批复中噪声防控的要求。	
--	--	--------------	------------------------------------	--

表 7 环境影响调查

施工期	生态影响	本项目为已建项目，补办环评手续，顾不作施工期生态影响调查。
	污染影响	/
	社会影响	/
运行期	生态影响	本项目码头泊位沿望虞河顺岸式布置，不占用望虞河的水域通道，对鱼类生存及洄游产生的影响较小。船舶航行会对周围水体产生扰动，这些会对水生生物的生物量、种类及栖息环境产生一定影响。由于船舶是在水体上层航行，主要影响也集中在上层水域，水生生物除富有生物在水体表层活动强度较大外，其他生物多在中层及底层活动，且水生生物除浮游生物在水体表层活动强度较大外，其他生物多在中层及底层活动，且水生生物的浮动性较强，会自动规避船舶带来的扰动。因此，船舶航行不会改变水生生物的栖息环境，也不会使生物种类、数量明显减少。因此运营期生态影响较小。
	污染影响	废水：本项目冲洗废水和雨水径流经沉淀池收集处理后回用于喷淋抑尘，设备、运输车辆和码头面及道路冲洗。路面喷洒水基本通过挥发损耗，装卸、堆场抑尘用水主要被黄砂吸收，无生产废水排放。舱底含油废水接收后定期委托常熟中法工业污水预处理有限公司处理。船舶生活污水接收后与陆域生活污水经过分散式污水处理装置处理后清运至常熟市中创污水处理有限公司处理，尾水排入锡北运河。对地表水影响较小。 固废：本项目生活垃圾委托镇环卫所清运处置。沉淀池污泥收集后与砂石料共同外售。 废气：本项目采用封闭料棚式堆场，砂石装卸配备水喷淋，颗粒物排放量小，对大气环境产生的影响较小。无组织颗粒物达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表 3 标准要求。 噪声：设置禁鸣标志，砂石装卸合理控制落料高度，选用低噪声设备。码头四周噪声排放标准达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）2类（东南侧4类）标准。
	社会影响	/

表 8 环境质量及污染源监测（附监测图）

项目	监测时间 监测频次	监测点位	监测项目	监测结果分析
生态	/	/	/	/
水	2021.03.24~ 2021.03.25 冲洗废水、 初期雨水 2天4次	沉淀池进、 出口（码头 沉淀池）	SS	验收监测期间，SS沉淀处理后符合《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1 洗涤用水限值。
气	2021.03.24~ 2021.03.25 无组织废气 2天4次	码头上风 向1个点， 下风向3个 点	颗粒物	验收监测期间，颗粒物排放符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表 3 限值。
声	2021.03.24~ 2021.03.25 东南、西南、 西北、东北 码头四周昼 间夜间两天 各一次	东南、西 南、西北、 东北厂界	噪声	验收监测期间，厂界的昼间噪声均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类（东南侧 4 类）标准。
电磁、振动	/	/	/	/
其他（航道 水环境）	2021.3.24~2 021.3.25	码头所在 河道下游 100米内	pH、高锰 酸钾指 数、COD、 SS、氨氮、 总磷、石 油类	验收监测期间，码头所在河道下游100米内水环境质量能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准（SS满足《地表水环境质量标准》（SL63-94）三级标准）

表 8-1 噪声监测结果表（附监测图）

点位 监测时间		Z1 西北 dB(A)	Z2 东北 dB(A)	Z3 东南 dB(A)	Z4 西南 dB(A)	执行标准 dB (A) (4 类/2 类)	评价
2021.03.24	昼间	57.3	56.5	54.8	56.0	70/60	达标
	夜间	47.3	46.2	44.9	45.6	55/50	达标
2021.03.25	昼间	56.6	55.4	54.9	56.0	70/60	达标
	夜间	46.9	45.3	45.0	47.0	55/50	达标
气象参数		2021 年 3 月 24 日，昼间：晴，风速 2.1m/s。夜间：晴，风速 2.3m/s。 2021 年 3 月 25 日，昼间：晴，风速 2.2m/s。夜间：晴，风速 2.1m/s。					
监测工况		正常生产					

验收监测期间，厂界的昼间夜间噪声均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB123348-2008）中 2 类（东南侧 4 类）标准。

表 8-2 无组织废气监测结果表（附监测图）

监测项目	监测日期	监测点位	检测结果（mg/m ³ ）				监控点与参照点总悬浮颗粒物 1 小时浓度值差值（mg/m ³ ）	标准限值（mg/m ³ ）	评价结论
			1	2	3	4			
颗粒物	2021.3.24	上风向 G1	0.013	0.028	0.043	0.052	0.037	0.5	达标
		下风向 G2	0.017	0.025	0.028	0.025			
		下风向 G3	0.040	0.015	0.020	0.015			
		下风向 G4	0.022	0.018	0.050	0.050			
	2021.3.25	上风向 G1	0.023	0.023	0.015	0.038	0.028	0.5	达标
		下风向 G2	0.028	0.027	0.015	0.040			
		下风向 G3	0.043	0.018	0.010	0.022			
		下风向 G4	0.035	0.027	0.033	0.015			
气象参数	2021 年 3 月 24 日，晴，风向：北，风速：2.4-2.5m/s； 2021 年 3 月 25 日，晴，风向：北，风速：2.4-2.5m/s；								

验收监测期间，颗粒物排放符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表 3 规定的大气污染物排放限值。

表 8-3 冲洗、初期雨水监测结果表

采样地点		码头沉淀池进口（单位：mg/L）						
样品状态		微黄弱少沉淀	微黄弱少沉淀	微黄弱少沉淀	微黄弱少沉淀	均值	回用标准	评价
2021.3.24	悬浮物	712	725	708	688	708	/	/
2021.3.25	悬浮物	638	672	651	666	657	/	/
采样地点		码头沉淀池进口（单位：mg/L）						
样品状态		微黄弱有沉淀	微黄弱有沉淀	微黄弱有沉淀	微黄弱有沉淀	均值	回用标准	评价
2021.3.24	悬浮物	28	26	22	25	25	30	符合
2021.3.25	悬浮物	27	23	24	26	25	30	符合

依据上表，码头沉淀池对悬浮物的去除率分别是 96.5%、96.2%。

冲洗废水和雨水径流经沉淀池处理后，可满足回用要求。

表 8-4 码头所在河道下游 100 内水环境

检测 点位	采样日期	样品 状态	检测项目						
			pH 值	悬浮物	化学 需氧 量	氨氮	总磷	高锰酸 钾指数	石油类
			无量纲	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
望 虞 河 （ 码 头 下 游 ）	2021.03.2 4 上午	微黄 微弱 少沉 淀	7.80	18	7	0.048	0.08	2.0	ND
	2021.03.2 4 下午	微黄 微弱 少沉 淀	7.80	22	8	0.051	0.09	1.9	ND
	2021.03.2 5上午	微黄 微弱 少沉 淀	7.82	17	7	0.169	0.08	2.1	ND
	2021.03.2 5 下午	微黄 微弱 少沉 淀	7.79	20	8	0.139	0.09	2.1	ND
限值			6-9	30	20	1.0	0.2	6	0.05
是否达标			是	是	是	是	是	是	是

由上表可知，码头正常运营期间，望虞河（码头下游）水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准（SS 满足《地表水资源质量标准》（SL63-94）三级标准）。码头运营对地表水影响较小。

监测点位示意图：

图 1：监测点位示意图

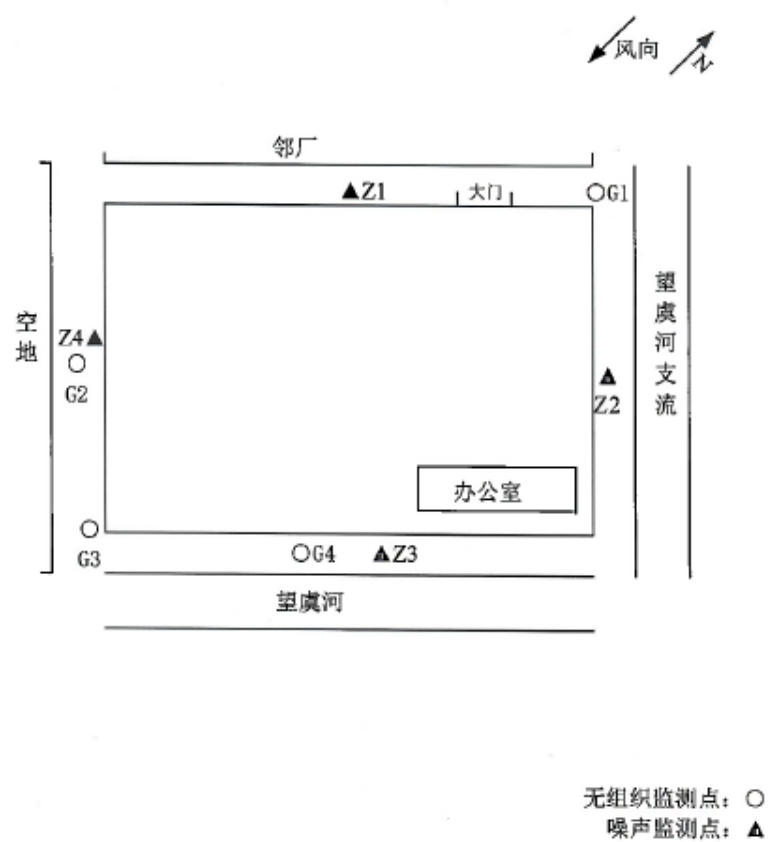


表 9 环境管理状况及监测计划

环境管理机构设置（分施工期和运行期）

施工期： 已建项目，补办环评手续，不做施工期调查。

运行期： 本项目运行期末配备专职人员负责环境保护，由码头企业法人主要负责码头的安全、环保问题。

环境监测能力建设情况

企业无环境监测能力，需委托有资质的第三方监测机构监测。

环境影响报告表中提出的监测计划及落实情况

表 9-1 建设项目环境监测项目一览表

类别	监测点位		监测项目	监测频次
废气	无组织废气	厂界外上风向1处，下风向3处	TSP	每年一次
废水	污水接管口		pH、COD、SS、NH ₃ -N、TP	每年一次
噪声	厂界外1米		等效声级	每季度一次，昼间测量
固废	-		统计全厂固废	每月统计一次

环境管理状况分析及建议

为贯彻落实《建设项目环境保护管理条例》，加强项目的环境保护工作，建设单位和施工单位的环境管理工作实行分级管理，有比较规范的环境管理体系，环保工作均有专人负责，日常的环境管理工作及建设项目的环境管理工作均能按照国家规定的要求进行。

试运营期间做好了以下制度：组建了环保、安全生产管理的专业队伍，负责污染物的治理工作和日常的安全工作；做好港区周边植被绿化及绿化养护工程；实行限速等措施降噪。

项目的环境管理执行了国家的环境影响评价制度、“三同时”制度，使项目的污染防治、生态保护措施基本得到了落实，并达到了应有的效果。

表 10 调查结论与建议

调查结论及建议

（一）调查结论

1、工程核查结论

本工程位于常熟市尚湖镇翁家庄村。本项目东侧为望虞河，北侧、南侧均为农田，西侧为一些工业企业。

常熟市巨达新型建材有限公司新建码头项目，利用占地面积 5500 平方米，购置相关设备，建设一个 300 吨级的货运码头泊位，年运输黄沙、散装水泥 20 万吨。

本项目实际投资为 500 万元，环保投资 15 万元，占比 3%。目前，项目工程已建设完成，满足竣工环保验收工况要求。

2、环保措施落实情况

本工程落实了环境影响评价文件和环保“三同时”管理制度要求，在工程建设过程中开展了大量切实有效的环境保护工作，环境影响报告表及批复文件中对本工程提出的环保措施基本得到了落实。

3、环境影响调查结论

根据现场调查结果，工程施工期间未发生环境污染事件，也未发生居民投诉事件，施工期环境污染防治措施得到了较好落实，未对周边环境质量造成明显不利影响。

3.1 大气环境调查

根据江苏中之盛环境科技有限公司监测报告，验收监测期间，码头上风向和下风向颗粒物浓度符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表 3 要求。

3.2 噪声环境调查

根据江苏中之盛环境科技有限公司监测报告，验收监测期间，码头四周的昼间噪声均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB123348-2008）中 2 类(东南侧 4 类)标准。

3.3 固体废弃物环境调查

本项目生活垃圾委托镇环卫所清运处置，沉淀池污泥收集与砂石料一同外售。固废实行“零”排放。

3.4 地表水环境

根据江苏中之盛环境科技有限公司监测报告，验收监测期间，望虞河（码头下游）

水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准（SS 满足《地表水资源质量标准》（SL63-94）三级标准）。码头运营对地表水影响较小。

4、验收调查结论

本工程在设计、施工基本落实了环评及批复要求的污染防治措施、生态保护措施和环境风险防范措施。施工期间未发生环境污染事故。因此，本次调查结论认为，本工程符合建设项目环境保护竣工验收条件，建议申请通过验收。

（二）环境保护管理建议

附件：

附件 1 环境影响报告表审批意见

附件 2 建设单位营业执照

附件 3 码头生活垃圾、生活污水清运协议

附件 4 租赁协议与用地红线图

附件 5 验收检测报告

附件 6 排污许可登记回执

附件 7 公众参与情况

附图：

附图 1 项目地理位置图

附图 2 项目周围概况图

附图 3 项目平面布置图

苏州市行政审批局

苏行审环评〔2021〕20185号

关于常熟市巨达新型建材有限公司 新建码头项目环境影响报告表的批复

常熟市巨达新型建材有限公司：

根据建设单位委托江苏中之盛环境科技有限公司编制的《常熟市巨达新型建材有限公司新建码头项目环境影响报告表》的评价结论，你公司在常熟市尚湖镇翁家庄村，新建码头（设置300吨级泊位1个，主要从事黄砂、水泥装卸，年吞吐量20万吨）项目（项目代码：2101-320581-89-01-786798）是可行的。要求严格按环境影响报告表所述认真落实各项污染防治措施和事故风险防范措施，并着重注意以下几个方面：

一、按“雨污分流、清污分流”的原则建设厂区排水管网，本项目不得有生产废水排放；本项目码头生活污水、船舶生活污水接管至常熟市中创污水处理有限公司集中处理。船舶含油废水经专用收集器收集后委托常熟市中法工业污水预处理有限公司进行处理。

二、本项目能源用电，不得设置燃煤炉（窑）；本项目采用封闭料棚式堆场，输送带设置密封罩，装卸扬尘采取水喷淋抑尘措施。本项目颗粒物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3标准。加强生产管理，减少大气污染物无组织排放。

三、合理布局，选用低噪音设备，采取有效消声、隔声、防振措施，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（东南侧执行4类标准）。

四、妥善处置或综合利用其它各类一般工业固体废弃物，生活垃圾（船舶、陆域）委托当地环卫部门处置，固体废弃物零排放。

五、同意报告表所述以本项目厂界边界为起点设置50m卫生防护

距离的要求，在此范围内不得设置居民住宅等环境敏感目标。

六、该项目在设计、施工建设和生产中总平面布局以及主要工艺设备、储运设施、公辅工程、污染防治设施安装、使用中涉及安全生产的应遵守设计使用规范和相关主管部门要求。

七、建设单位应对环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

八、按苏环控[97]122号文要求，规范设置各类排污口和标识。建设单位应按环评报告所述的企业自行监测要求规范开展自行监测。

九、该项目实施后，建设单位应在排放污染物之前按照国家规定的程序和要求向环保部门办理排污许可相关手续，做到持证排污、按证排污。按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》办理环保设施竣工验收手续。需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者经验收不合格，建设项目已投入生产或者使用的，生态环境部门将依法进行查处。

十、苏州市常熟生态环境局组织开展该工程的“三同时”监督检查和日常监督管理工作，苏州市生态环境综合行政执法局负责不定期抽查。

十一、建设单位是该建设项目环境信息公开的主体，须自收到我局批复后及时将该项目报告表的最终版本予以公开。同时应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号）做好建设项目开工前、施工期和建成后的信息公开工作。

十二、如该项目所涉及污染物排放标准发生变化，应执行最新的排放标准。

十三、该项目在建设过程中若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施、设施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响评价文件须报重新审核。

苏州市行政审批局
2021年3月11日

主题词：环保 建设项目 报告表 批复

抄送：苏州市生态环境局，苏州市常熟生态环境局，苏州市生态环境综合行政执法局，苏州市固体废物管理中心，苏州市环境应急与事故调查中心

苏州市行政审批局办公室

2021年3月11日印发

共印：7份

附件 2、建设单位营业执照

统一社会信用代码 9132058167700584XH (1/1)		营业执照 (副本)		编号 32058166620191210010	
名称 常熟市巨达新型建材有限公司		注册资本 500万元整		扫描二维码，登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。	
类型 有限责任公司		成立日期 2008年06月16日		登记机关 2019年11月21日	
法定代表人 沈耀耀		营业期限 2008年06月16日至*****			
经营范围 干粉砂浆生产项目；按常熟环保局常环计2008-113号文件执行；干粉砂浆生产、加工、销售；新型建材研制；道路普通货物运输，货物专用运输（罐式）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		住所 常熟市尚湖镇翁家庄村			
国家企业信用信息公示系统网址： http://www.gsxt.gov.cn		市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。		国家市场监督管理总局监制	

附件 3 港口经营许可证

	
中华人民共和国港口经营许可证	
(副 本)	
证书编号:	(苏苏虞)(内河)港经证(0012)号
公司名称:	常熟市巨达新型建材有限公司
法定代表人:	沈耀耀
办公地址:	常熟市尚湖镇翁家庄
经营地域:	常熟市巨达新型建材有限公司 苏州内河港常熟内河港区专用码头通用散货 1#泊位
发证机关:	1.为船舶提供码头设施服务; 2.在港区范围内提供货物装卸服务。
有效期至:	2023 年 2 月 11日
发证日期:	2023 年 2 月 12 日

中华人民共和国交通运输部 监制

附件 4、码头生活垃圾清运协议

清运垃圾协议书

甲方：常熟市尚湖镇翁家庄村劳务合作社

乙方：常熟市巨达新型建材有限公司

为进一步美化环境，切实做好公司垃圾清运工作，经甲乙双方协商，本着公开、平等、有偿的原则，达成协议如下：

一、公司地址：翁家庄村河南湾 101 号；

二、协议期限：为三年，自 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止；

三、收费标准：根据常熟市物价局、财政局的相关规定，结合甲方实际情况，收取一定的有偿垃圾清运费，具体收费标准为 3000 元/年；

四、有关事项的约定：

1、乙方需根据内部所产生垃圾量配备相应的垃圾桶，如垃圾桶配备不足，堆放在垃圾桶外的垃圾，甲方将不作清理；

2、乙方必须将垃圾桶放在交通方便，位置合适便于甲方垃圾清运车辆正常工作；

3、无特殊原因，甲方应做到日产日清；

4、未尽事宜双方协商解决；

五、安全方面：甲方在处理垃圾过程中所造成的交通事故及其它事故，乙方不负任何责任；

六、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字后即生效；

甲方盖章签字：常熟市尚湖镇翁家庄村劳务合作社

乙方盖章签字：常熟市巨达新型建材有限公司

二〇二〇年一月十二日

附件 5 租赁协议与土地证相关材料

证明

常熟市生态环境局：

常熟市巨达新型建材有限公司新建干散货码头项目，建设地址：
常熟市尚湖镇翁家庄村河西 101 号，项目租用尚湖镇翁家庄村集体地
块，用地面积 5514 平方米，该地块为存量建设用地。

特此证明。



尚湖镇翁家庄村村委会

二〇二〇年十二月





附件 6 生活污水清运协议

污水处理服务协议

甲方：常熟市中创污水处理有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：常熟市巨达新型建材有限公司（以下简称“乙方”）

为了保护环境发展经济，积极响应政府号召，从自身做起保护环境，乙方决定将本公司产生的污水送交给甲方进行处理。现就乙方所产生的污水进行处理与甲方在公平、友好的基础上，达成以下协议：

1 服务范围

- 1.1 在本协议规定的服务期限内，乙方应按本协议约定将污水从位于上述乙方地址的工厂用槽罐车运输至甲方设施。乙方委托甲方提供污水处理服务，甲方应按本协议约定接收该污水并且提供污水处理服务。
- 1.2 本协议签字之日起生效。

2 污水技术参数

- 2.1 乙方向甲方输送的污水应当符合接管水质标准。
- 2.2 乙方生产过程中排放污水所含主要污染物名称：污水
- 2.2 接管水质标准：

接管标准符合常熟市尚湖镇人民政府和常熟市中创污水处理有限公司签订 BOT 协议中规定指标，其它污染物物质参照《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015。

具体接管标准如下：

项目	BOD ₅	COD _{Cr}	SS	NH ₃ -N	TN	TP	PH	
(mg/L)	≤250	≤500	≤250	≤35	≤45	≤3	6~9	

3 污水处理

- 3.1 在下列情况下，甲方将拒绝接受乙方排放的污水且不承担任何责任：
- (1) 乙方的污水不符合接管水质标准的任何一项技术参数要求（“不合格污水”），即污水的流量或任何一个因子超过接管水质标准列明的最大值或者污水含有接管标准 2.2 未列明的因子；
- (2) 乙方废水中主要污染物质种类变更，而不提前通知甲方。

4 计量和采样

- 4.1 计量方式为按吨计算。
- 4.2 甲方有权对乙方排放的污水不定期采样，每次采样甲乙双方各留一份。若我司采样分析结果超过接管标准，将通知乙方。若乙方有疑义，乙方有权委托常熟市环保局对甲方留样进行检测。
- 4.3 污水来自乙方工厂，乙方负责运输到甲方设施，乙方应自行承担由于运输污水所发生的所有相关费用。

5 费用、付款及支付方式

5.1 在本合同规定的水质指标以及本合同期限内，甲方提供服务的服务费用为：__元/年。

5.2 付款周期为一个日历年（“计费期”）。

6 违约责任

6.1 若乙方向甲方排放不合格污水，造成甲方无法达到其对有关主管部门承担的义务并受到有关部门处罚的，乙方应向甲方支付因此造成甲方的任何支出。

6.2 任何一方在履行本协议过程中造成另一方损失的，应根据本协议赔偿另一方的该等损失。为避免疑义，除非本协议另有约定外，任何一方不对另一方的任何间接损失承担赔偿责任。

7 甲乙双方的职责

7.1 运行期间，甲方负责对乙方符合接管要求的污水进行达标处理。

7.2 运行期间，如发生突发事件引起甲方设施停运，甲方应按制定的应急预案执行，确保乙方正常生产。如甲方在应急处理过程中确实有不可抗拒因素，与乙方协商解决。

7.3 乙方在任何时候都应当确保污水符合接管标准所列的技术参数要求。

7.4 乙方排放污水如偷排造成影响，一经核实，如造成污染事故及追究刑事责任均由乙方负责。

8 服务期限

8.1 自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止。如需继续履行合同，则甲、乙双方重新签订合同。

9 法律适用及争议的解决

9.1 本协议应适用中华人民共和国法律并按其解释。

9.2 若本协议双方对本协议有任何争议，应通过友好协商解决。

10 本协议的签署

10.1 本协议自双方签订之日起生效。

10.2 本协议以中文签署，一式两（2）份，两方各执一（1）份。

甲方：（盖章） 常熟市中创污水处理有限公司 授权代表： （签字或盖章） 姓 名： 职 位： 日期： 年 月 日	乙方：（盖章） 常熟市巨达盛 授权代表： （签字或盖章） 姓 名： 职 位： 日期： 年 月 日
---	--

常熟市巨达新型建材有限公司
含油废水处置合同



目 录

总则.....3

1. 双方声明.....3

2. 工作内容及期限.....4

3. 费用.....4

4. 甲方责任与义务.....4

5. 乙方责任与义务.....5

6. 违约.....5

7. 双方代表.....6

8. 合同终止与赔偿.....6

9. 争议与仲裁.....7

10. 其他条款.....7

甲方：常熟市巨达新型建材有限公司

地址：常熟市尚湖镇翁家庄村

法定代表人：沈耀耀

乙方：常熟中法工业污水预处理有限公司

地址：常熟市海虞镇香桥村

法定代表人：王缘

总则

为妥善处置含油污水，甲方委托乙方提供含油污水处理服务，为明确委托运营的服务内容、双方责任及相关的服务费用，经双方协商一致达成本协议条款。

术语和定义

含油污水：船舶运营中产生的含有原油、燃油、润滑油和其他各种石油产品及其残余物的污水，包括机器处所有污水和含货油残余物的油污水。交办海<2019>15号指出含油污水按照废水实施管理，不在《国家危险废物名录》内。

1. 双方声明

1.1 甲方声明：

- 1.1.1 甲方具有全部权力和授权签署本合同，并履行本合同的义务。
- 1.1.2 甲方声明其拥有的本污水处理装置是合法的、正常运行的；甲方对本污水处理装置的资产设置的任何抵押、担保、债务以及由此而引起的经济和法律責任与乙方无关。
- 1.1.3 甲方存在的诉讼、仲裁、纠纷、被追索和行政处罚与乙方无关。
- 1.1.4 甲方提供给乙方的所有文件、资料皆是最新、数据真实、准确、完整的。
- 1.1.5 本污水处理装置委托乙方运行支持导致的甲方与其他方的法律纠纷，与乙方无关。
- 1.1.6 甲方承诺不会采取任何违反法律、法规和本合同约定的行动影响乙方对本含油度

水的处置工作。

1.2 乙方声明：

- 1.2.1 乙方具有全部权力和授权签署本合同，并履行本合同的义务。
- 1.2.2 乙方目前不存在足以影响其履行本合同的情形。
- 1.2.3 乙方有足够的履行本合同约定的义务。
- 1.2.4 乙方承诺不会采取任何违反法律、法规和本合同约定的行动影响对本含油废水的处置工作。

2. 工作期限

2.1 具体工作内容及期限如下：

含油废水处置期限为 12 个月，2021 年 1 月 28 日至 2022 年 1 月 29 日。

3. 费用

- 3.1 乙方根据本合同的规定按转运量向甲方收取处置费用，每年度含油废水每年度总量不得超过 2 吨，处置费用 2000/次。处置费用包括含油废水转运费用、含油废水处置费用。甲方应于收到乙方当月发票的下月底前支付处置费用乙方指定的账户，每逾期一天甲方应当向乙方支付相当于应付金额千分之五的违约金给乙方，直至应付金额及逾期违约金全额付至乙方账户。

4. 甲方责任与义务

- 4.1 甲方应任命一名代表负责与乙方的工作联络及处理相关事宜。

- 4.2 甲方应负责含油废水的收集及储存工作，储存及收集的具体要求如下：

- 1) 甲方应设置独立的含油废水储存站点，储存站点设置有清晰的标识、铭牌，负责人名称及联系方式，有良好的通风、防雨。
- 2) 甲方在储存站点内应设置符合自身实际用量大小沉淀池，沉淀池两侧分别设置含油废水倾倒口和含油废水的转输口，其中含油废水转输口应靠近公路方便运输。沉淀池需做好防渗、防漏措施。确保含油废水不外溢。
- 3) 含油废水沉淀池四周应设置围栏，围栏高度不应小于 1.2 米，围栏每 60 公分设置横杆，围

栏底部做踢脚板。在倾倒口及转输口的围栏要方便开启，平时上锁。

- 4.3 甲方废水转运前应提前 10 个工作日与乙方联系，确定转运时间。如乙方因进水冲击等特殊原因无法接收，需待乙方厂区生产恢复后告知甲方，再行确定转运时间。
- 4.4 甲方应按照本合同规定的要求向乙方支付费用。
- 4.5 甲方应确保仅含油废水进入储存站点。如因甲方原因有《国家危险名录》中涉及的物质进入储存站点，并通过转运进入乙方处理厂，造成乙方损失的，由甲方承担涉及的所有费用。
- 4.6 甲方要确保现场人员配合乙方转运或者技术人员的工作。
- 4.7 甲方负责协调处理所有对外事宜。
- 4.8 甲方应以书面形式完成对甲方的通知、通报、申请、说明、确认等行为，并交甲方代表或委托人签收。
- 4.9 甲方负责含油废水储存点的建设、检修、维修、维护，并承担相应的费用。

5. 乙方责任与义务

- 5.1 在合同期内乙方不承担任何因甲方原因产生的含油废水处理不当导致的任何责任。
- 5.2 乙方负责含油废水的转运及处置工作，具体内容如下：
 - 1) 乙方应按照本合同任命一名代表负责与甲方的工作联络及处理相关事宜。
 - 2) 乙方委托第三方物业公司进行含油废水的运输工作。
 - 3) 第三方物业公司做到点对点运输，从含油废水储存点至我司指定的收纳点，中途不得经过其他站点，转运路线除有不可抗力等特殊因素需变更外，转运路线需提前制定并备案。
 - 4) 第三方物业公司转运含油废水做到专车，车辆上需安装 GPS，车辆实时信息需联网，便于实时调取。如专车有变更，做好变更备案工作。
 - 5) 乙方做好含油废水的接收工作。
- 5.3 如因甲方发展或客观条件发生变化时，含油废水总量接近乙方处理总量时，除合同约定的 2t 含油废水外，乙方有义务提前 10 个工作日通知甲方现状情况，并有权拒绝甲方额外的含油废水量。
- 5.4 乙方应以书面形式完成对甲方的通知、通报、申请、说明、确认等行为，并交甲方代表或委托人签收。

6. 违约

除本合同第 4.5 条规定的违约行为及违约责任外，双方应就其他违约行为向对方支付该违约行为给

对方造成的实际损失，最高不超过乙方所得到的运行支持费用的 20%。

7. 双方代表

7.1 甲方代表：

7.1.1 甲方代表为甲方任命的代表甲方工作的当事人。

7.1.2 甲方代表因事不能处理本合同事务时，甲方代表可将权利部分或全部委托给其他委托人，由其他委托人行使甲方代表的部分或全部权利（应有书面的确认函）。

7.2 乙方代表：

7.2.1 乙方代表为乙方任命的代表乙方工作的当事人。

7.2.2 乙方代表因事不能处理本合同事务时，乙方代表可将权利部分或全部委托给其他委托人，由其他委托人行使乙方代表的部分或全部权利（应有书面的确认函）。

8. 合同终止与赔偿

8.1 甲方的终止

下述每一条款所述事件，如果不是由于不可抗力或甲方违约所致，如果有允许的纠正期限而在该期限内未能纠正，即构成乙方违约事件，甲方有权立即发出终止意向通知，通知书到达对方时本合同即告终止：

8.1.1 乙方根据中国法律进行清算或资不抵债；

8.1.2 乙方在第 1.2 条款中的任何声明被证明在做出时不属实，使乙方履行本合同的能力受到严重的不利影响；

8.1.3 乙方未履行本协议项下的义务，构成对本协议的实质性违约，并且在收到甲方要求其说明违约并补救的书面通知后三十（30）日内仍未能补救该实质性违约；

8.1.4 本合同中规定的其它终止事由。

8.2 乙方的终止

8.2.1 下述每一条款所述事件，如果不是由于乙方的违约或由于不可抗力所致，如果有允许的纠正期限而在该期限内未能纠正，即构成甲方违约事件，乙方有权立即发出终止意向通知，通知书到达对方时本合同即告终止：

8.2.2 甲方在第 1.1 条款中的任何声明被证明在做出时不属实，使甲方履行本合同的能力受到严重的不利影响；

8.2.3 甲方延迟支付运行支持费超过一个月；

8.2.4 甲方未履行本协议项下的责任和义务构成本协议的实质性违约，并且在收到乙方要求其说明违约并补救的书面通知后三十（30）日内仍未能补救该实质性违约；

8.2.5 本合同中规定的其它终止事由。

8.3 终止后的处理

若本合同根据第 8.2 条的规定终止，甲方应向乙方支付以下费用：

8.3.1 截止至终止日，甲方应向乙方支付的运行支持费及逾期违约金（如有）。若终止日不是一个自然月的月底，则终止日当月的运行支持费则根据比例进行结算；

8.3.2 因终止合同导致乙方需要遣散雇佣的管理、行政、运行人员所发生的所有费用，包括但不限于工资、奖金、解除劳动合同赔偿金等，以及根据法律因特殊原因不能解除合同而需要发生的所有费用。

9. 争议与仲裁

9.1 如在执行本合同或解释有关规定时产生争议或分歧，甲乙双方应通过协商努力解决，并形成书面补充协议，书面补充协议对双方均有约束力。

9.2 不能通过协商解决的争端应提交苏州市仲裁委员会在苏州进行仲裁。

9.3 任何仲裁裁决是终局裁决，对双方均应有约束力。

9.4 仲裁期间，双方仍应履行合同规定的其它工作。

10. 其他条款

10.1 通知：若本协议签约各方的通信地址、联系人或其他联系渠道更改时，应在更新使用前及时通知其他方。

10.2 保密：未经对方同意，甲乙双方均不得将本合同、商务文件、财务文件、技术文件、协议、纪要、备忘的全部内容以任何形式泄露给第三方。违约方须承担赔偿责任。

10.3 法律和语言：汉语是本合同双方的工作语言。如发生仲裁，适用的语言亦为汉语。仲裁文件、有关说明均以汉语的解释为准。

10.4 本合同的订立、效力、解释、履行及争端均受中华人民共和国法律的保护和管辖。

10.5 本合同共四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。

10.6 本合同自双方签字盖章之日起即行生效。

签字页（本页无正文）

甲方：常熟市巨达新型建材有限公司（盖章）

代表人：_____

签字日期：2021年1月28日

乙方：常熟中法工业污水预处理有限公司（盖章）

代表人：_____

签字日期：2021年1月28日

附件8验收检测报告



检 测 报 告

TEST REPORT

(2021)中之盛（委）字第（03174）号

委托单位： 常熟市巨达新型建材有限公司
项目名称： 验收检测
检测类别： 委托检测
报告日期： 2021 年 03 月 31 日

江苏中之盛环境科技有限公司

Jiangsu zhongzhisheng Environmental Technology Co., Ltd



检测报告说明

- 一、报告封面无 CMA 章仅作为科研、教学或内部质量控制之用，检测数据处无本公司检测报告专用章无效，报告无骑缝章无效。
- 二、对本报告检测结果如有异议，请于收到之日起十天内向本公司提出，逾期不予受理。在受理申诉中，对无法保存、复现的样品，本公司不作复测。
- 三、由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责，对检测结果不作评价。
- 四、未经本公司同意，本报告不得以任何方式复制。经同意复制的复印件，由我公司加盖公章予以确认。部分复印无效。
- 五、除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再留样。
- 六、委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况，以上排放标准由客户提供。
- 七、任何对本报告未经授权之涂改、伪造、变更及不当使用均属违法，其责任人将承担相关法律及经济责任，本公司保留对上述违法行为追究法律责任的权利。
- 八、报告无相关责任人签字无效。

江苏中之盛环境科技有限公司

地 址：常熟市海虞镇学前路 28 号奥特莱斯 A3 幢 202

邮 编：215500

电 话：0512-83818585

江苏中之盛环境科技有限公司 检测报告

委托单位	常熟市巨达新型建材有限公司		
通讯地址	常熟市尚湖镇翁庄路查村路望虞河边		
联系人	沈耀耀	联系电话	13701575739
采样单位	江苏中之盛环境科技有限公司		
采样日期	2021.03.24-2021.03.25	采样人员	祝嘉铭、邓毓珂
检测日期	2021.03.24-2021.03.27	检测人员	陶李晗、毛晓烨、何莉等
检测目的	受常熟市巨达新型建材有限公司委托对废水、地表水、废气、噪声进行检测		
检测内容	废水：悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、pH 值 地表水：pH 值、化学需氧量、悬浮物、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、石油类 无组织废气：颗粒物 厂界噪声：昼间噪声、夜间噪声		
检测依据	见附件 1。		
检测仪器	见附件 2。		
检测结论	检测结果详见报告第 2-12 页，表 1-表 11，监测点位示意图见图 1。 (报告中评价标准均由委托方提供)		
编制： <u>陆怡恬</u> 审核： <u> </u> 签发： <u> </u> (授权签字人)  签发日期： <u>2021</u> 年 <u>03</u> 月 <u>27</u> 日			

表1: 常熟市巨达新型建材有限公司2021.03.24码头沉淀池废水检测结果表

采样地点		码头沉淀池进口 (单位: mg/L)						
样品编号		202103174-001	202103174-002	202103174-003	202103174-004	均值		
采样时间		08:42	11:22	14:08	16:42			
样品状态		微黄弱有沉淀	微黄弱有沉淀	微黄弱有沉淀	微黄弱有沉淀			
2021.03.24	悬浮物	712	725	708	688	708		
采样地点		码头沉淀池出口 (单位: mg/L)						
样品编号		202103174-005	202103174-006	202103174-007	202103174-008	均值	评价标准	评价
采样时间		08:45	11:28	14:14	16:48			
样品状态		微黄弱少沉淀	微黄弱少沉淀	微黄弱少沉淀	微黄弱少沉淀			
2021.03.24	悬浮物	28	26	22	25	25	30	符合
备注		评价标准:《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T 19923-2005)表 1。						

表2: 常熟市巨达新型建材有限公司2021.03.24废水检测结果表

采样地点		生活污水接管口 (单位: mg/L pH 值无量纲)						
样品编号		202103174-009	202103174-010	202103174-011	202103174-012	均值或范围	接管标准	评价
采样时间		09:05	11:35	14:20	17:02			
样品状态		微白弱少沉淀	微白弱少沉淀	微白弱少沉淀	微白弱少沉淀			
2021.03.24	pH 值	7.84	7.83	7.82	7.79	7.79~7.84	6~9	符合
	悬浮物	48	47	52	44	48	250	符合
	氨氮	0.163	0.157	0.224	0.163	0.177	35	符合
	化学需氧量	207	212	180	189	197	500	符合
	总磷	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	3	符合
备注		评价标准: 污水处理厂接管标准。						

表3: 常熟市巨达新型建材有限公司2021.03.25码头沉淀池废水检测结果表

采样地点		码头沉淀池进口 (单位: mg/L)						
样品编号		202103174-034	202103174-035	202103174-036	202103174-037	均值		
采样时间		08:47	11:27	14:13	16:47			
样品状态		微黄弱有沉淀	微黄弱有沉淀	微黄弱有沉淀	微黄弱有沉淀			
2021.03.25	悬浮物	638	672	651	666	657		
采样地点		码头沉淀池出口 (单位: mg/L)						
样品编号		202103174-038	202103174-039	202103174-040	202103174-041	均值	评价标准	评价
采样时间		08:50	11:33	14:19	16:53			
样品状态		微黄弱少沉淀	微黄弱少沉淀	微黄弱少沉淀	微黄弱少沉淀			
2021.03.25	悬浮物	27	23	24	26	25	30	符合
备注		评价标准:《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T 19923-2005)表 1。						

表4: 常熟市巨达新型建材有限公司2021.03.25废水检测结果表

采样地点		生活污水接管口 (单位: mg/L pH 值无量纲)						
样品编号		202103174-042	202103174-043	202103174-044	202103174-045	均值或范围	接管标准	评价
采样时间		09:10	11:40	14:25	17:07			
样品状态		微白弱少沉淀	微白弱少沉淀	微白弱少沉淀	微白弱少沉淀			
2021.03.25	pH 值	7.72	7.71	7.71	7.73	7.71~7.73	6~9	符合
	悬浮物	37	44	32	31	36	250	符合
	氨氮	0.054	0.048	0.230	0.647	0.245	35	符合
	化学需氧量	229	236	216	239	230	500	符合
	总磷	0.10	0.09	0.09	0.08	0.09	3	符合
备注		评价标准: 污水处理厂接管标准。						

表 5: 常熟市巨达新型建材有限公司 2021.03.24 地表水检测 results 表

样品 编号	样品 名称	样品 状态	检 测 项 目						单 位: mg/L pH 值无量纲	
			悬浮物	pH 值	化学需氧 量	氨氮	总磷	高锰酸盐 指数	石油类	
202103174-013	望虞河码头下 游-1	微黄、微弱、少沉淀	18	7.80	7	0.048	0.08	2.0	ND	
202103174-014	望虞河码头下 游-2	微黄、微弱、少沉淀	22	7.80	8	0.051	0.09	1.9	ND	
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 IV类标准			/	6-9	≤30	≤1.5	≤0.3	≤10	≤0.5	
《地表水水质质量标准》（SL63-94）四级			≤60	/	/	/	/	/	/	
评价			符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合	
备注	ND 表示未检出，石油类的方法检出限为 0.01mg/L。									

(2021)中之盛(委)字第(03174)号

表 6: 常熟市巨达新型建材有限公司 2021.03.25 地表水检测结果表

样 品			检 测 项 目							单 位: mg/L pH 值无量纲	
样品 编号	样品 名称	样品 状态	悬浮物	pH 值	化学需氧 量	氨氮	总磷	高锰酸盐 指数	石油类		
202103174-046	望虞河码头下 游-1	微黄、微弱、少沉淀	17	7.82	7	0.169	0.08	2.1	ND		
202103174-047	望虞河码头下 游-2	微黄、微弱、少沉淀	20	7.79	8	0.139	0.09	2.1	ND		
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 IV类标准			/	6-9	≤30	≤1.5	≤0.3	≤10	≤0.5		
《地表水资源质量标准》（SL63-94）四级			≤60	/	/	/	/	/	/		
评 价			符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合		
备注	ND 表示未检出，石油类的方法检出限为 0.01mg/L。										

表7: 常熟市巨达新型建材有限公司2021.03.24厂界无组织废气检测结果表

监测项目	监测点位	监测值(mg/m ³)					《水泥工业大气污染物排放标准》 (GB4915-2013)表3	评价
		第一次	第二次	第三次	第四次	下风向 最大值		
颗粒物	上风向 G ₁	0.013	0.028	0.043	0.052	/	0.5mg/m ³	/
	下风向 G ₂	0.017	0.025	0.028	0.025	0.050		符合
	下风向 G ₃	0.040	0.015	0.020	0.015			
	下风向 G ₄	0.022	0.018	0.050	0.050			
备注	监测期间气象参数见表 8。监测点位示意图见图 1。							

表 8: 监测期间气象参数

监测日期		气温 (°C)	气压 (kPa)	风速 (m/s)	风向	天气情况
2021.03.24	第一次	13.4	102.4	2.5	北	晴
	第二次	18.3	102.2	2.4		
	第三次	20.8	102.1	2.4		
	第四次	21.9	101.9	2.4		

表 8: 常熟市巨达新型建材有限公司 2021.03.25 厂界无组织废气检测结果表

监测项目	监测点位	监测值(mg/m ³)					水泥工业大气污染物 排放标准 (GB4915-2013)表 3	评价
		第一次	第二次	第三次	第四次	下风向 最大值		
颗粒物	上风向 G ₁	0.023	0.023	0.015	0.038	/	0.5mg/m ³	/
	下风向 G ₂	0.028	0.027	0.015	0.040	0.043		符合
	下风向 G ₃	0.043	0.018	0.010	0.022			
	下风向 G ₄	0.035	0.027	0.033	0.015			
备注	监测期间气象参数见表 9, 监测点位示意图见图 1。							

表 9: 监测期间气象参数

监测日期		气温 (°C)	气压 (kPa)	风速 (m/s)	风向	天气情况
2021.03.25	第一次	14.2	102.1	2.5	北	晴
	第二次	16.9	101.9	2.5		
	第三次	20.2	101.8	2.4		
	第四次	20.8	101.7	2.4		


表 10: 常熟市巨达新型建材有限公司 2021.03.24 噪声检测结果表

测量仪器及编号					轻便三杯风向风速表 FYF-1 zzs-096 多功能声级计 AWA6228+ zzs-098 声校准器 AWA6021A zzs-100				
声级计 校准	昼间	测量前 93.8dB (A)			气象条件	昼间 天气：晴 风力：2.1m/s			
		测量后 93.8dB (A)							
	夜间	测量前 93.8dB (A)			气象条件	夜间 天气：晴 风力：2.3m/s			
		测量后 93.8dB (A)							
测定编号	测点位置	检测日期：2021.03.24							
		昼间				夜间			
		测点 时间	等 效 声 级 dB (A)	排放 限值	评价	测点 时间	等 效 声 级 dB (A)	排放 限值	评价
Z1	西北厂界外 1 米	11:40	57.3	60	符合	23:00	47.3	50	符合
Z2	东北厂界外 1 米	11:44	56.5	60	符合	23:04	46.2	50	符合
Z3	东南厂界外 1 米	11:47	54.8	70	符合	23:07	44.9	55	符合
Z4	西南厂界外 1 米	11:50	56.0	60	符合	23:11	45.6	50	符合
备注		噪声排放限值依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)，其中Z3东南侧执行4类标准，其余三侧执行2类标准。 监测点位示意图见图1。							

表 11: 常熟市巨达新型建材有限公司 2021.03.25 噪声检测结果表

测量仪器及编号				轻便三杯风向风速表 FYF-1 zzs-096 多功能声级计 AWA6228+ zzs-098 声校准器 AWA6021A zzs-100					
声级计 校准	昼间	测量前 93.8dB (A)		气象条件		昼间 天气：晴 风力：2.2m/s			
		测量后 93.8dB (A)							
	夜间	测量前 93.8dB (A)		气象条件		夜间 天气：晴 风力：2.1m/s			
		测量后 93.8dB (A)							
测定编号	测点位置	检测日期：2021.03.25							
		昼间				夜间			
		测点 时间	等 效 声 级 dB (A)	排放 限值	评价	测点 时间	等 效 声 级 dB (A)	排放 限值	评价
Z1	西北厂界外 1 米	11:45	56.6	60	符合	23:05	46.9	50	符合
Z2	东北厂界外 1 米	11:48	55.4	60	符合	23:09	45.3	50	符合
Z3	东南厂界外 1 米	11:52	54.9	70	符合	23:12	45.0	55	符合
Z4	西南厂界外 1 米	11:55	56.0	60	符合	23:15	47.0	50	符合
备注		噪声排放限值依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)，其中Z3 东南侧执行4类标准，其余三侧执行2类标准。 监测点位示意图见图1。							

图 1: 监测点位示意图

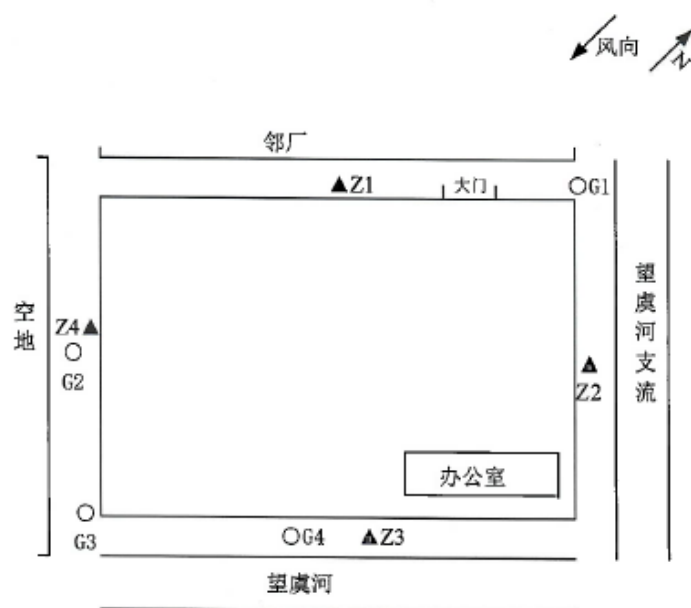

无组织监测点: ○
噪声监测点: ▲

*****报告结束*****

附件 1

检测依据一览表

分析项目	检测标准
颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 及修改单
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989
高锰酸盐指数	水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989
pH 值	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986
石油类	水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行） HJ970-2018
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008

附件 2

检测仪器一览表

仪器名称	型号	仪器编号
十万分之一天平	SQP quintix125d-1cn	zzs-003
万分之一天平	岛津 ATX224	zzs-054
紫外可见分光光度计	752 型	zzs-059
空盒气压表	DYM3	zzs-092
温湿度仪	TES-1360A	zzs-094
轻便三杯风向风速表	FYF-1	zzs-096
多功能声级计	AWA6228+	zzs-098
声校准器	AWA6021A	zzs-100
高负载大气颗粒物采样器	MH1200-F 型	zzs-113
高负载大气颗粒物采样器	MH1200-F 型	zzs-114
高负载大气颗粒物采样器	MH1200-F 型	zzs-115
高负载大气颗粒物采样器	MH1200-F 型	zzs-116
pH 计	雷磁 PHS-3E	zzs-154
恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205 型	zzs-196
恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205 型	zzs-197
恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205 型	zzs-198
恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205 型	zzs-199

附件 3

噪声质量控制结果统计表

监测日期	监测前校准声级值 dB(A)	监测后校准声级值 dB(A)	示值偏差 dB(A)	备注
2021.03.24	93.8	93.8	0.0	测量前、后校准值 偏差不大于 0.5dB(A), 测量数据 有效。
2021.03.25	93.8	93.8	0.0	

固定污染源排污登记回执

登记编号：9132058167700584XH001X

排污单位名称：常熟市巨达新型建材有限公司

生产经营场所地址：常熟市尚湖镇翁家庄村

统一社会信用代码：9132058167700584XH

登记类型：☒首次 ☐延续 ☐变更

登记日期：2020年04月11日

有效期：2020年04月11日至2025年04月10日



注意事项：

- （一）你单位应当遵守生态环境保护法律法规、政策、标准等，依法履行生态环境保护责任和义务，采取措施防治环境污染，做到污染物稳定达标排放。
- （二）你单位对排污登记信息的真实性、准确性和完整性负责，依法接受生态环境保护检查和社会公众监督。
- （三）排污登记表有效期内，你单位基本情况、污染物排放去向、污染物排放执行标准以及采取的污染防治措施等信息发生变动的，应当自变动之日起二十日内进行变更登记。
- （四）你单位若因关闭等原因不再排污，应及时注销排污登记表。
- （五）你单位因生产规模扩大、污染物排放量增加等情况需要申领排污许可证的，应按规定及时提交排污许可证申请表，并同时注销排污登记表。
- （六）若你单位在有效期满后继续生产运营，应于有效期满前二十日内进行延续登记。



更多资讯，请关注“中国排污许可”官方公众微信号

附件10公众参与情况

本项目采用网络媒体公示的方法征求公众意见，公示网址为：
<https://www.jszzs.com.cn/cate/ela.html?filter=&id=16&diyname=ela&page=2>

具体内容如图所示：

新闻资讯

• 招聘信息

• 环保动态

• 公司新闻

您现在的位置： 首页 > 项目公示 >

常熟市巨达新型建材有限公司新建码头项目竣工环境保护验收前公示

常熟市巨达新型建材有限公司新建码头项目

竣工环境保护验收前公示

常熟市巨达新型建材有限公司投资500万元人民币，在常熟市尚湖镇俞家庄村新建码头项目。根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T394-2007）及有关文件的规定，受常熟市巨达新型建材有限公司的委托，江苏中盛环保科技有限公司指导其开展项目竣工环境保护验收工作。

按《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T394-2007）有关规定，为了了解公众对工程施工及试运行期环境保护工作的意见，以及工程建设对工程影响范围内居民工作和生活的影响情况，需开展公众意见调查，欢迎公众积极参与并提出宝贵意见。

（一）建设项目的名称

新建码头项目。

（二）建设项目工程概况

常熟市巨达新型建材有限公司利用占地面积5500平方米，购置相关设备，建设一个300吨级的货运码头泊位，年运输黄沙、散装水泥20万吨。

（三）建设项目的建设单位的名称和联系方式

建设单位：常熟市巨达新型建材有限公司

联系人：朱先生

联系电话：18120080939

通讯地址：常熟市尚湖镇俞家庄村

（四）项目竣工环境保护验收指导机构的名称和联系方式

环评单位：江苏中盛环保科技有限公司

联系人：姚先生

联系电话：0512-52874177

通讯地址：常熟市海虞镇学前路28号常熟虞特莱斯A3幢202

（五）征求公众意见的主要事项

a)工程施工期是否发生过环境污染事件或扰民事件。

b)公众对建设项目施工期、试运行期存在的主要环境问题和可能存在的环境影响方式的看法与认识。

c)公众对建设项目施工期、试运行期采取的环境保护措施效果的满意度。

d)公众关注的环境及资源利用的环境保护措施。

e)公众对建设项目环境保护工作的总体评价。

（六）征求意见的方式及时问

本项目附近、受本项目影响或其他关心本项目建设及其环境影响的公众，可以通过来访、传真、电话或填写公众意见表邮件的方式，向建设单位或指导单位发表关于本项目施工期、试运行期的相关意见、看法。


公示期限：验收公示时间为2021年3月18日，公示至项目召开竣工环境保护验收会。

/uploads/20210318/eb36a44add9a6891c6dd86f1ec996816.pdf

公示期间，无公众反馈相关意见。

63


附图 1 项目地理位置图

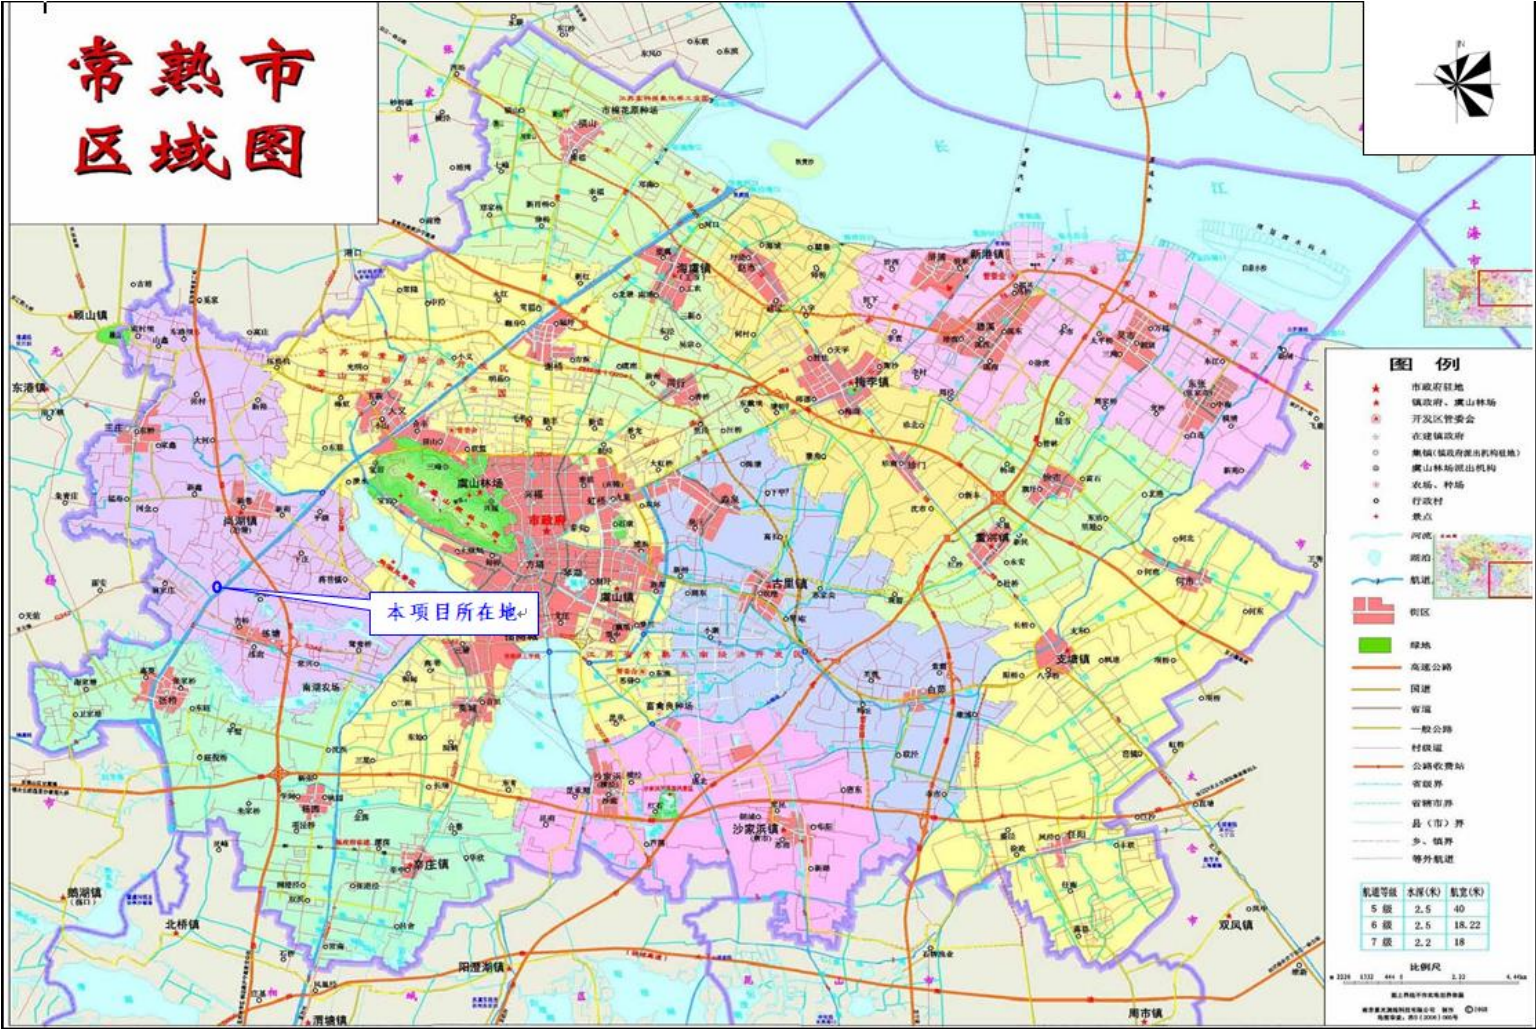

附图 2 项目周边环境概况图



附图3 项目平面布置图

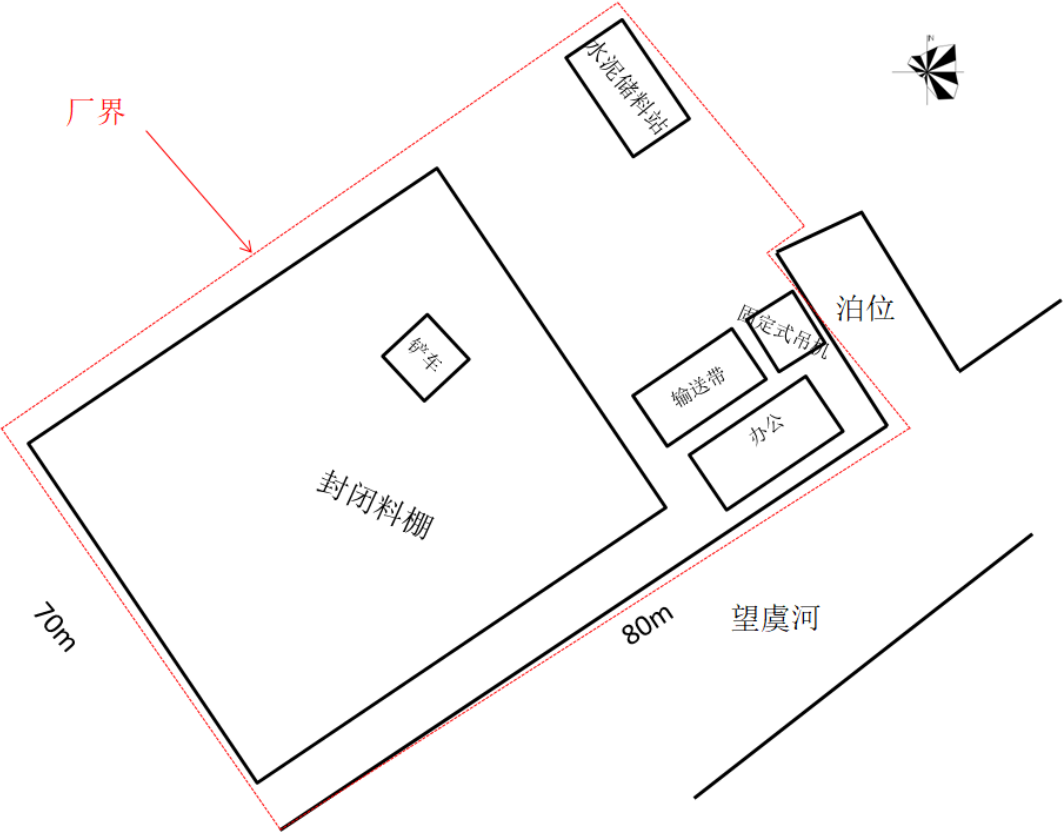

常熟市巨达新型建材有限公司
新建码头项目一般变动环境影响分析

建设单位：常熟市巨达新型建材有限公司

编制日期：二〇二一年四月

目 录

一、项目概况..... 1

二、变动情况..... 1

三、评价要素..... 7

四、环境影响分析说明..... 7

五、结论..... 7

常熟市巨达新型建材有限公司

新建码头项目一般变动环境影响分析

一、项目概况

常熟市巨达新型建材有限公司投资 500 万元于 2008 年租赁下尚湖镇翁家庄村土地 5500m²，建设了一座砂石堆场，目前码头进行黄砂、散装水泥的转运，并占用望虞河岸线 20 米。码头设有 1 个 300 吨的泊位，码头前沿设有 3 吨吊机 1 台，年经营黄砂、散装水泥共 20 万吨。

由于历史原因，码头项目并未办理环境影响评价手续，根据建设单位提供资料，目前码头已建成运营约 13 年，在运营期间未曾发生污染纠纷问题。根据《常熟市内河港口码头环保问题整改方案》的相关精神和要求，常熟市巨达新型建材有限公司申请补办码头项目环境影响评价手续，通过整改做到依法纳规。

本项目于 2021 年 1 月 11 日获得常熟市行政审批局赋码，环评报告表于 2021 年 2 月由江苏中之盛环境科技有限公司编制完成，于 2021 年 3 月 11 日获得苏州市行政审批局的批复(苏行审环评[2021]20185 号)。

该项目在码头环保问题整改中，生活污水经分散式污水处理装置处理后由常熟市中创污水处理有限公司清运处理。依据环办[2015]52 号文《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》及省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知要求，常熟市巨达新型建材有限公司委托江苏中之盛环境科技有限公司对“常熟市巨达新型建材有限公司新建码头项目”环境影响评价进行建设项目一般变动环境影响分析。

我单位接受委托后，组织了有关专业技术人员听取了项目变动情况的介绍，调研、收集和核实了项目变动的相关资料，按照省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知要求组织实施该项目环评的变动环境影响分析工作，编制建设项目一般变动环境影响分析，提交建设单位，为项目的建设单位和行政审批提供技术支持。

二、变动情况

《常熟市巨达新型建材有限公司新建码头项目》已于 2021 年 3 月 11 日获得苏州市行政审批局的批复(苏行审环评[2021]20185 号), 审批部门审批决定及执行情况见下表。

表 1 审批部门审批决定及执行情况表

苏州市行政审批局审查意见	实际环境检查结果	落实结论
一、按“雨污分流、清污分流”的原则建设厂区排水管网, 本项目不得有生产工艺废水排放。本项目码头生活污水及船舶生活污水接管至常熟市中创污水处理有限公司集中处理; 船舶含油废水经专用收集器收集后委托常熟市中法工业污水预处理有限公司进行处理。	按“雨污分流、清污分流”的原则建设厂区排水管网, 本项目无生产废水排放; 含油废水交由常熟中法工业污水预处理有限公司处理, 码头生活污水和船舶生活污水收集后接入分散式污水处理装置处理后由常熟市中创污水处理有限公司清运处理。	一般变动
二、本项目能源用电, 不得设置燃煤炉(窑); 本项目采用封闭料棚式堆场, 输送带设置密封罩, 装卸扬尘采取水喷淋抑尘措施, 本项目颗粒物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013) 表 3 标准。加强生产管理, 减少大气污染物无组织排放。	本项目能源用电, 无燃煤炉(窑); 本项目采用封闭料棚、输送带安装密封罩、装卸扬尘采取水喷淋处理后在码头无组织排放。本项目颗粒物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013) 表 3 标准。	落实
三、合理布局, 选用低噪声设备, 采取有效消声、隔声、防振措施, 确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类(东南侧执行 4 类标准) 标准。	本项目采取消声、隔声、防振措施, 确保厂界噪声达标。	落实
四、妥善处置或综合利用其他各类一般工业固体废弃物, 生活垃圾(船舶+陆域) 委托当地环卫部门处置, 固体废弃物零排放。	沉淀污泥收集后混入砂石中外售; 生活垃圾(船舶、陆域) 则委托环卫所清运, 固体废弃物零排放。	落实
五、同意报告表所述以厂界边界为起点设置 50 米卫生防护距离的要求, 在此范围内不得设置居民住宅等环境敏感目标。	厂界边界 50m 卫生防护距离内无居民住宅等环境敏感目标。	落实
六、该项目在设计、施工建设和生产中总平面布局以及主要工艺设备、储运设施、公辅工程、污染防治设施安装、使用中涉及安全生产的应遵守设计使用规范和相关部门要求。	该项目在设计、施工建设和生产中总平面布局以及主要工艺设备、储运设施、公辅工程、污染防治设施安装、使用中涉及安全生产的均遵守设计使用规范和相关部门要求。	落实

七、建设单位应对环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。	——	— —
八、按环控[97]122 号文要求，规范设置各类排污口和标识。建设单位应按环评报告所述的企业自行监测要求规范开展自行监测。	规范设置各类排污口和标识,按环评报告所述的企业自行监测要求规范开展自行监测。	落实
九、该项目实施后，建设单位应在排放污染物之前按照国家规定的程序和要求向环保部门办理排污许可相关手续，做到持证排污、按证排污。按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》办理环保设施竣工验收手续。需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者经验收不合格，建设项目已投入生产或者使用的，生态环境部门将依法进行查处。	已取得排污登记。	落实
十、苏州市常熟生态环境局组织开展该工程的“三同时”监督检查和日常监督管理工作，苏州市环境监察支队负责不定期抽查。	——	— —
十一、建设单位是该建设项目环境信息公开的主体，须自收到我局批复后及时将该项目报告表的最终版本予以公开。同时应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162 号）做好建设项目开工前、施工期和建成后的信息公开工作。	——	——
十二、如该项目所涉及污染物排放标准发生变化，应执行最新的排放标准。	——	——
十三、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、生态破坏的措施发生重大变化的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自批准之日起，如超过 5 年方决定该工程开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。	——	——

表 2 工程变更内容及环境影响变化情况

类型	原环评内容和要求	实际建设内容	变动内容	变动原因	不利环境影响变化情况
项目的性质	新建（补办环评）	新建（补办环评）	无变动	无变动	无
规模	利用占地面积 5500 平方米，购置相关设备，建设一个 300 吨级的货运码头泊位，年运输黄砂、袋装水泥 20 万吨。	利用占地面积 5500 平方米，购置相关设备，建设一个 300 吨级的货运码头泊位，年运输黄砂、袋装水泥 20 万吨。	无变动	无变动	无
地点	常熟市尚湖镇翁家庄村	常熟市尚湖镇翁家庄村	无变动	无变动	无
生产工艺	砂石的装卸存储。	砂石的装卸存储。	无变动	无变动	无
环境保护措施	大气：封闭料棚、输送带密封罩、水喷淋等措施。 地表水：船舶含油废水收集后上岸交由常熟中法工业污水处理有限公司处理。陆域生活污水和船舶生活污水收集后接管至常熟市中创污水处理有限公司集中处理。 固废：沉淀池污泥混入砂石中外售。生活垃圾（船舶和陆域）委托环卫所清运。	大气：封闭料棚、输送带密封罩、水喷淋等措施。 地表水：船舶含油废水收集后上岸交由常熟中法工业污水处理有限公司处理。陆域生活污水和船舶生活污水收集后经过分散式污水处理装置处理后委托常熟市中创污水处理有限公司清运。 固废：沉淀池污泥混入砂石中外售。生活垃圾（船舶和陆域）委	陆域生活污水和船舶生活污水收集后采用分散式污水处理装置处理后委托常熟市中创污水处理有限公司清运。	项目所在地不具备接管条件，暂时采用清运的方式处理生活污水。	无

		托环卫所清运。			
--	--	---------	--	--	--

依据环办[2015]52 号文《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》，根据其中《港口建设项目重大变动清单（试行）》判断本息项目是否存在重大变动，具体见表 3。

表 3 项目变动情况一览表

序号	类别	《港口建设项目重大变动清单（试行）》内容	项目对照情况
1	性质	码头性质发生变动，如干散货、液体散货、集装箱、多用途、件杂货、通用码头等各类码头之间的转化。	不涉及
2	规模	码头工程泊位数量增加、等级提高、新增罐区（堆场）等工程内容。	不涉及
3		码头设计通过能力增加 30%及以上。	不涉及
4		工程占地和用海总面积（含陆域面积、水域面积、疏浚面积）增加 30%及以上。	不涉及
5		危险品储罐数量增加 30%及以上。	不涉及
6	地点	工程组成中码头岸线、航道、防波堤位置调整使得评价范围内出现新的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区和要求更高的环境功能区。	不涉及
7		集装箱危险品堆场位置发生变化导致环境风险增加。	不涉及
8	生产工艺	干散货码头装卸方式、堆场堆存方式发生变化，导致大气污染源强增大。	不涉及
9		集装箱码头增加危险品箱装卸作业、洗箱作业或堆场。	不涉及
10		集装箱危险品装卸、堆场、液化码头新增危险品货类（国际危险品分类：9 类），或新增同一货类中毒性、腐蚀性、爆炸性更大的货种。	不涉及
11	环境保护措施	矿石码头堆场防尘、液化码头油气回收、集装箱码头压载水灭活等主要环境保护措施或环境风险防范措施弱化或降低。	不涉及

结合环办[2015]52 号文《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》中《港口建设项目重大变动清单（试行）》，进行综合分析，本公司的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施均未发生重大变动，未构成重大变动。

三、评价要素

原环评中评价等级、评价范围、评价标准等均未发生变化。

四、环境影响分析说明

本项目生活污水处理方式发生改变，对地表水环境影响不变。

五、结论

根据环办[2015]52 号文《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》中《港口建设项目重大变动清单（试行）》，本项目不属于重大变更，可纳入验收管理。

第三部分 竣工环境保护验收意见

常熟市巨达新型建材有限公司新建码头项目 竣工环境保护验收意见

根据《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第 682 号)的规定,常熟市巨达新型建材有限公司新建码头项目于 2021 年 04 月 03 日组织环评编制及验收监测单位(江苏中之盛环境科技有限公司)以及 2 位专家组成验收工作组(名单附后),对公司“常熟市巨达新型建材有限公司新建码头项目”进行竣工环保验收。验收工作组根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4 号)、竣工环境保护验收调查报告表、环境影响报告表及苏州市行政审批局批复(苏行审环评[2021]20185 号)等文件,经现场踏勘、审阅相关资料和讨论,提出竣工环境保护验收意见如下:

一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

建设地点:常熟市尚湖镇翁家庄村。

建设规模及主要建设内容:本项目为新建(补办)项目,占地面积为 5514 平方米。购置相关设备(具体见验收调查报告表),建设 300 吨级泊位 1 个,从事黄砂、水泥装卸年吞吐量 20 万吨。

本项目员工 6 人,年工作 300 天, 1 班制,每班工作 8 小时,年工作时数 2400 小时。

(二)建设过程及环保审批情况

本项目于 2008 年 03 月建成。2020 年 12 月,根据常熟市人民政府办公室印发《常熟市内河港口码头环保问题整改方案》的通知(常政办发[2020]150 号)的要求,补办环评手续。本项目于 2021 年 1 月获得常熟市行政审批局备案证(常行审投备〔2021〕61 号);2021 年 02 月江苏中之盛环境科技有限公司编制本项目环境影响报告表,并于 2021 年 03 月 12 日取得苏州市行政审批局批复(苏行审环评[2021]20185 号)。

江苏中之盛环境科技有限公司于 2021 年 03 月 24 日~25 日进行

验收监测，并出具检测报告(编号：(2021)中之盛(委)字第(03174)号)，常熟市巨达新型建材有限公司于2021年03月编制完成《常熟市巨达新型建材有限公司新建码头项目竣工环境保护验收调查报告表》。

公司于2020年04月11日完成固定污染源排污登记(登记编号：9132058167700584XH001X)。

本项目立项、建设、试生产、验收监测过程中无环境投诉、违法或处罚记录。

(三)投资情况

本项目实际总投资500万元，其中环保投资15万元，占总投资比例为3%。

(四)验收范围

本次验收范围为“苏行审环评[2021]20185号”批复对应的常熟市巨达新型建材有限公司新建码头项目生产设备及公辅设施。建设300吨级泊位1个，从事黄沙、水泥装卸年吞吐量20万吨。

二、工程变动情况

本项目实际建设内容与环评相比主要发生如下变动：

(一)废水处理方式的变动：环评中船舶及码头生活污水接管至常熟市中创污水处理有限公司集中处理；实际为污水经自建分散式生活污水处理设施处理后委托环卫部门清运处理。

根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》(环办[2015]52号)的相关规定，上述变动不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

(一)废水

本项目废水主要为径流雨水、地面冲洗废水、装卸机械及运输车辆冲洗废水、船舶及码头生活污水、船舶舱底含油污水。其中径流雨水、地面冲洗废水、装卸机械及运输车辆冲洗废水经沉淀池处理后循环使用，不外排。船舶及码头生活污水委托尚湖镇练塘环卫所清运处理，已提供污水清运处理协议。船舶舱底含油污水委托常熟中法工业污水预处理有限公司定期清运收集处理，已提供含油废水处置合同。

本项目已建 4*1.5*2 的三级沉淀池 1 座。

(二)废气

本项目废气主要为物料装卸过程产生的扬尘（装卸粉尘、堆场扬尘、汽车运输粉尘）。装卸扬尘经防尘网+喷淋抑尘装置处理后在码头无组织排放。

(三)噪声

本项目噪声主要为吊机、车辆船舶噪声等。本项目合理布局公用设备，并经过隔声、距离衰减措施来降低噪声对周围环境的影响。

(四)固体废物

本项目产生的固废主要为一般固废与生活垃圾。职工生活垃圾与船舶生活垃圾委托常熟市尚湖镇翁家庄村劳务合作社清运处理，已提供生活垃圾清运协议。一般固废为沉淀池沉淀过程会产生少量沉渣，收集后混入黄沙外售。

(五)其他环境保护设施

本项目已按环评及批复要求“以码头边界为起点设置 50m 卫生防护距离”，目前在该卫生防护距离内无居民住宅等环境敏感目标。

四、环境保护设施调试效果

江苏中之盛环境科技有限公司于 2021 年 03 月 24 日~25 日对本项目进行现场验收监测，并根据验收监测结果编制了竣工环境保护验收调查报告表，根据“验收调查报告表”，验收监测期间：

(一)工况

公司生产设备、环保设施正常运行，运输吞吐量负荷均大于 75%，满足竣工环境保护验收监测工况要求。

(二) 环保设施处理效率

本项目三级沉淀池对 SS 的去除效率分别是 96.5%、96.2%。

(三)污染物排放情况

1、废水

本项目生活污水接管口 pH 值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷日均浓度达到常熟城西污水处理厂接管标准。三级沉淀池出水中 SS 日均浓度符合《城市污水再生利用 工业用水水质》

(GB/T19923-2005) 表 1 洗涤用水限值。

2、废气

本项目厂界无组织监控点颗粒物最大浓度监测值符合《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013) 中表 3 中无组织排放监控浓度限值。

3、噪声

厂界南、西、北侧昼间等效连续 A 声级均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 类标准；东南侧昼间等效连续 A 声级达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 4 类标准。

4、固废

本项目产生的固废主要为一般固废与生活垃圾。职工生活垃圾与船舶生活垃圾委托常熟市尚湖镇翁家庄村劳务合作社清运处理，已提供生活垃圾清运协议。一般固废为沉淀池沉淀过程会产生少量沉渣，收集后混入黄沙外售。

五、工程建设的环境的影响

根据“验收调查报告表”：本项目属补办环评，实际项目已建成运行，工程的施工建设未对周围大气、声、地表水、土壤、地下水、生态环境造成明显影响。码头下游（望虞河）地表水中 pH、化学需氧量、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、石油类日均浓度符合《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) 中Ⅲ类标准，悬浮物日均浓度符合《地表水环境质量标准》(SL63-94) 三级标准。

开展公众意见调查方面：为了了解公众对工程运行期环境保护工作的意见，公司于2021年03月18日采用网络媒体公示的方法征求公众意见，公示期间，无公众反馈相关意见。

六、验收结论

本项目执行了环保“三同时”制度，基本落实了环评及批复要求的污染防治措施，环保设施运行正常，主要污染物达标排放。对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，验收工作组认为：“常熟市巨达新型建材有限公司新建码头项目”竣工环保设施验收合格。

七、后续要求

(一) 加强现场管理，尽可能减少废气无组织排放，避免对周边环境产生影响。

(二) 加强沉淀池的运行维护，加强对沉淀池出水的监测监控，确保出水水质可满足回用要求，不外排。

八、验收工作组人员信息

验收工作组人员名单附后。

常熟市巨达新型建材有限公司

2021 年 04 月 03 日

第四部分：其它需要说明的事项

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

常熟市巨达新型建材有限公司新建码头项目在建设过程中将项目的环境保护设施纳入了初步设计之中，各项环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，常熟市巨达新型建材有限公司各项环境保护设施没有编制环境保护篇章。建设项目在项目建设过程中严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染达标排放，落实防治污染和生态破坏的措施，项目在建设过程中严格按照环评报告表及批复的要求落实了防止污染的措施和相关的生态环保措施。

1.2 施工简况

/

1.3 验收过程简述

本建设项目在 2021 年 3 月委托江苏中之盛环境科技有限公司对项目噪声、废水、废气进行验收监测。2021 年 4 月由常熟市巨达新型建材有限公司组织了环保验收会议，由验收监测单位、建设单位及相关专家组成验收工作小组，对本项目提出验收意见，验收工作组在现场检查、资料查阅等基础上，经认真讨论形成会议结论如下：本项目执行了环保“三同时”制度，基本落实了环评及批复要求的污染防治措施，环保设施运行正常，主要污染物达标排放。对照《建设项目竣

工环境保护验收暂行办法》，验收工作组认为：“常熟市巨达新型建材有限公司新建码头项目”竣工环保设施验收合格。

1.4公众反馈意见及处理情况

在本建设项目设计、施工、试运行和验收期间没有收到过公众反馈意见或投诉。

2. 制度措施落实情况

2.1 制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

常熟市巨达新型建材有限公司未专门设立环保机构，由码头负责人全权负责，进行统一管理。

（2）环境风险防范措施

码头每年定期演练1次，加强对于环境风险的防范。

（3）环境监测计划

类别	监测点位		监测项目	监测频次
废气	无组织废气	厂界外上风向1处，下风向3处	TSP	每年一次
废水	污水接管口		pH、COD、SS、NH ₃ -N、TP	每年一次
噪声	厂界外1米		等效声级	每季度一次，昼间测量
固废	-		统计全厂固废	每月统计一次

2.2其他措施落实情况

本项目不涉及如林地补偿、珍惜动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设等情况。

2.3整改工作情况

本项目建设前依法办理了环保审批手续，建设过程中贯彻执行了环保“三同时”制度，项目建设过程中无重大变更情况存在，项目配套建设的环保设施已建设完成并能够正常运行；本项目无新增废气、废水、噪声排放，码头运行过程中产生的废气、废水和噪声均能稳定达标排放，码头运行过程中产生的固体废物均得到妥善的处理和处置。本项目无《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条规定的情形存在，没有需要整改的工作情况。
